



ŞANLIURFA İLİNDE DEVAM EDEN VE YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMLAR



ŞANLIURFA İLİNDE DEVAM EDEN VE YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMLAR

İLİMİZDE ÇEŞİTLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT; **137** ADET DEVAM EDEN VE **56** ADET PLANLANAN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA **193** ADET YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT; **2** ADET DEVAM EDEN VE **1** ADET PLANLANAN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA **3** ADET YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

HALİLİYE BAMYASUYU ASM+TSM BİNASI



- İHALE TARİHİ :26.08.2015
- İHALE BEDELİ :3.735.000 TL
- NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI :% 80
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI :% 92
- BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ :2015/2017



EYYUBİYE ASM+TSM BİNASI



- İHALE TARİHİ :25.08.2015
- İHALE BEDELİ :8.680.00 TL
- NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI :% 80
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI :% 92
- BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ :2016/2017



1700 YATAKLI ŐEHİR HASTANESİ



- İHALE BEDELİ :
- NAKDİ GERÇEKLEŐME ORANI :% 0
- FİZİKİ GERÇEKLEŐME ORANI :% 0
- BAŐLAMA/BİTİŐ TARIHİ :





İLLER BANKASI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLLER BANKASI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT; **2** ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

BOZOVA (ŞANLIURFA) ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI



- **İhale Tarihi** : 05.11.2013
- **İhale Bedeli** : 5.609.570,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 85,85
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 85,85
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 26.12.2013 – 09.02.2017 (İnşaat Bitiş) / 16.03.2018 (İşletme Bitiş)



HILVAN (ŞANLIURFA) ATIKSU ARITMA TESİSİ



- **İhale Tarihi** : 15.12.2013
- **İhale Bedeli** : 7.303.069,01
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**% 89
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 89
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :29.11.2013-26.06.2014 (12.08.2016 Geçici Kabul yapılmış olup işletme dönemi devam etmektedir.)





ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

**ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT;
2 ADET PLANLANAN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.**

GÖLPINAR TABİAT PARKI ALTYAPI PROJESİ



- **İhale Bedeli** : -
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : %0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2018-2020
- **Proje Detayı** : 2018 yılı için içme suyu şebekesi yapımı, su deposu yapımı, kanalizasyon şebekesi yapımı tamamlanacaktır. 2019 yılı için sıcak asfalt araç yolu ve yol kenarı su kanalları yapımı, beton parke orman içi yol yapımı tamamlanacaktır. 2020 yılı için Beton parke orman içi yol yapımı, yer altı elektrik şebekesi yapımı tamamlanacaktır. Altyapı tesisleri idaremiz tarafından üstyapı tesisleri işletmecisi tarafından yapılacaktır.



BİRECİK KELAYNAK ÜRETME İSTASYONU, İDARE ve ZİYARETÇİ TANITIM MERKEZİ, KELAYNAK BAKIM ve TEDAVİ MERKEZİ BİNA İÇİ DÜZENLEMESİ



- **İhale Bedeli** : -
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : %0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : -
- **Proje Detayı** : Birecik Kelaynak Üretim İstasyonu, İdare ve Ziyaretçi tanıtım Merkezi, Kelaynak bakım ve tedavi Merkezi ile Nizamiye yapımı 2016 yılında 1.720.000 TL yatırım ile tamamlanmıştır. Ziyaretçi tanıtım merkezine gelen ziyaretçilere Şanlıurfa ilinin flora ve faunasını anlatmak ve kelaynak kuşlarını ürkütmeden ileri teknoloji kameralar ile izlemek amacıyla Binanın iç düzenlemesi için tahmini 1.000.000 TL'ye ihtiyaç vardır. Konu Proje aşamasında olup, herhangi bir sorun bulunmamaktadır.






DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜNÜN **5** ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

CEYLANPINAR İLÇESİ YERLİ ELEKTRİK ŞEBELESİ VE GENEL AYDINLATMA YAPIM İŞİ



- **İhale Bedeli** :31.11.2016
- **İhale Bedeli** :4.127.222,49 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 56
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı**:% 75
- **Başlama tarihi** : 23.12.2017
- **İşin bitim tarihi** : 15.09.2017
- **Proje Detayı** : Ceylanpınar İlçesi yeraltı elektrik şebekesi, sayaç toplulaştırma ve genel aydınlatma tesis işi.

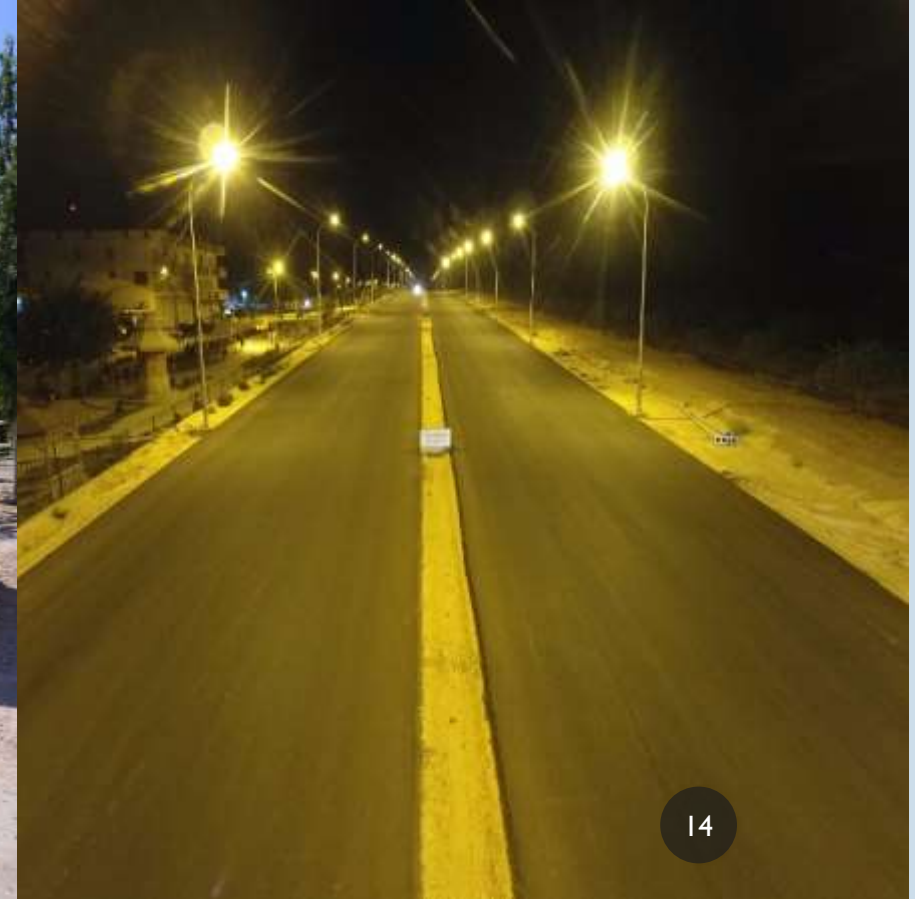

DİCLE EDAŞ ŞANLIURFA İLİ KARAKÖPRÜ İLÇESİ KARAKÖPRÜ-3 AG-YG TESİS VE ASOP MONTAJ YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** : 20.6.2016
- **İhale Bedeli** : 4.799.891,07 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 81,22
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 99
- **Başlama Tarihi** : 12.8.2016
- **İşin bitim tarihi** : 01.09.2017
- **Proje Detayı** : Elektrik şebekesi yeraltına alınması Sayaç toplulaştırma ve Genel Aydınlatma yapılması



ŞANLIURFA İLİ İLÇELERİNDE KÜÇÜK EK TESİSLER ELETRİK TESİS YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** : 07.03.2017
- **İhale Bedeli** : 2.510.663,41 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı: 0**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : 3
- **Başlama Tarihi** :13.04.2017
- **İşin bitim tarihi** :31.12.2017
- **Proje Detayı** : Şanlıurfa ili ilçelerinde küçük ek tesisler elektrik tesis yapım işi



ŞANLIURFA İLİ VİRANŞEHİR İLÇESİ ESER - TAŞYAKA ENH



İhale Tarihi	: 27.12.2016
İhale Bedeli	: 6.050.894,44 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı	:% 25
Fiziki Gerçekleşme Oranı	:% 15
İşin bitim tarihi	: 30.08.2017



VİRANŞEHİR İLÇESİ YERALTI ELETRİK TESİS VE GENEL AYDINLATMA YAPIM İŞİ



- **İhale Bedeli** :31.11.2016
- **İhale Bedeli** :1.702.366, 31 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 39
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 75
- **Başlama Tarihi** :23.12.2016
- **İşin bitim tarihi** :15.09.2017
- **Proje Detayı** : Elektrik şebekesi yeraltına alınması Sayaç toplulaştırma ve Genel Aydınlatma yapılışı





DSİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT; 37 ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

AŐAĐI FIRAT II. MERHALE PROJESİ MARDİN CEYLANPINAR OVALARI CAZİBE SULAMASI 1. KISIM ŐEBEKE İKMALİ



- **İhale Tarihi** : 20.07.2016
- **İhale Bedeli** : 328 161 880 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 95
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 13
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 07.10.2016/07.10.2019
- **Proje Detayı** :26 496 ha tarım arazisinin sulama ve şebekesinin yapılması.



AŐAĐI FIRAT II. MERHALE PROJESİ

MARDİN CEYLANPINAR OVALARI CAZİBE SULAMASI 2. KISIM ŐEBEKE



- **İhale Tarihi** : 06.05.2014
- **İhale Bedeli** : 145 500 000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%78
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 25.06.2014 /05.10.2019
- **Proje Detayı** :23 169 ha tarım arazisinin sulama ve drenaj şebekesinin yapılması



AŐAĐI FIRAT II. MERHALE PROJESİ VİRANŐEHİR POMPAJ SULAMASI 1. KADEME



- İhale Tarihi : 18.02.2016
- İhale Bedeli : 114 617 105,43 TL
- Nakdi Gerçekleşme Oranı:% 100
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :%31
- İşe Başlama / Bitiş Tarihi : 03.05.2016/06.11.2018
- Proje Detayı :22 012 ha tarım arazisinin sulama şebekesinin yapılması



AŐAĐI FIRAT II. MERHALE PROJESİ

VİRANŐEHİR POMPAJ SULAMASI 1. KADEME MALZEME ALIMI



- İhale Tarihi : 18.08.2016
- İhale Bedeli : 53 148 006 TL
- Nakdi Gerçekleşme Oranı:%93
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :%74
- İşe Başlama / Bitiş Tarihi : 01.11.2016 /28.08.2017
- Proje Detayı :22 012 ha tarım arazisinin sulama şebekesinin boru alımı



AŐAĐI FIRAT II. MERHALE PROJESİ VİRANŐEHİR POMPAJ SULAMASI 2. KADEME



- **İhale Tarihi** : 05.02.2015
- **İhale Bedeli** : 238 050 973 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : %100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %68
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 06.04.2015 /20.11.2018
- **Proje Detayı** : 15.616 ha tarım arazisinin sulama ve drenaj şebekesinin yapılması



AŐAĐI FIRAT II. MERHALE PROJESİ

YUKARI HARRAN OVASI ŐEBEKE İÇİ EK SAHA SULAMASI



- **İhale Tarihi** : 10.12.2015
- **İhale Bedeli** : 11 215 000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 58
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 98
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 27.01.2016 /08.05.2017
- **Proje Detayı** :1.065 ha tarım arazisinin sulama Őebekesinin yapılması



AŐAĐI FIRAT II. MERHALE PROJESİ ŐANLIURFA-HARRAN OVALARI SULAMASI İKMALİ VE TAHLİYE KANALI DERİNLEŐTİRİLMESİ 2.KISIM



- **İhale Tarihi** : 09.09.2014
- **İhale Bedeli** : 65 229 047 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 98
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 72
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 06.02.2015/31.12.2017
- **Proje Detayı** :Proje kapsamında 235 840 m tahliye kanalı açılması ve tahliye kanalları üzerindeki sanat yapıları yer almaktadır. Tahliye kanallarının derinleştirileceĐi sulama sahası 151 419 ha'dır.



AŐAĐI FIRAT II. MERHALE PROJESİ

ŐANLIURFA VE HARRAN OVALARI TAHLİYE KANALLARI ÜZERİNDEKİ SANAT YAPILARI



- **İhale Tarihi** : 25.06.2013
- **İhale Bedeli** : 10 493 628 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 41
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 80
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 26.08.2013/31.12.2017
- **Proje Detayı** :Mevcut olarak bulunan fakat ihtiyaca cevap vermeyen menfezleri yeni yapılacak olan toplam 203 adet menfez, 29 adet giriş yapısı, 43 adet tahliye kavşut yapısı, 480 kanalet kavşutu ve İdarece ihale aşamasında öngörölmeyen ancak işin devamı sırasında acil ihtiyaç olabilecek sanat yapıları bulunmaktadır.



SURUÇ OVASI POMPAJ SULAMASI PROJESİ TAŞBASAN SAĞ SAHİL ŞEBEKE




- **İhale Tarihi** : 18.08.2011
- **İhale Bedeli** : 85 763 033 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 60
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 94
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 04.11.2011/31.12.2017
- **Proje Detayı** : Taşbasan Sağ Sahil Şebeke Yapım İşİ, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı altında bulunan toplam brüt 17657 ha alanın sulanmasını sağlayacak boru hatları ve üzerindeki sanat yapıları inşaatının yapımı işidir.



SURUÇ OVASI POMPAJ SULAMASI PROJESİ TAŞBASAN SOL SAHİL 1. KISIM ŞEBEKE



- **İhale Tarihi** : 24.06.2011
- **İhale Bedeli** : 45 769 802 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 99
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 25.01.2013/31.12.2017
- **Proje Detayı** :Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanalı üzerinde bulunan Y1~Y10 Yedek Prizleri vasıtasıyla toplam brüt 13112 ha alanı sulayacak borulu sulama şebekesi ve üzerindeki sanat yapıları inşaatının yapılması işidir.

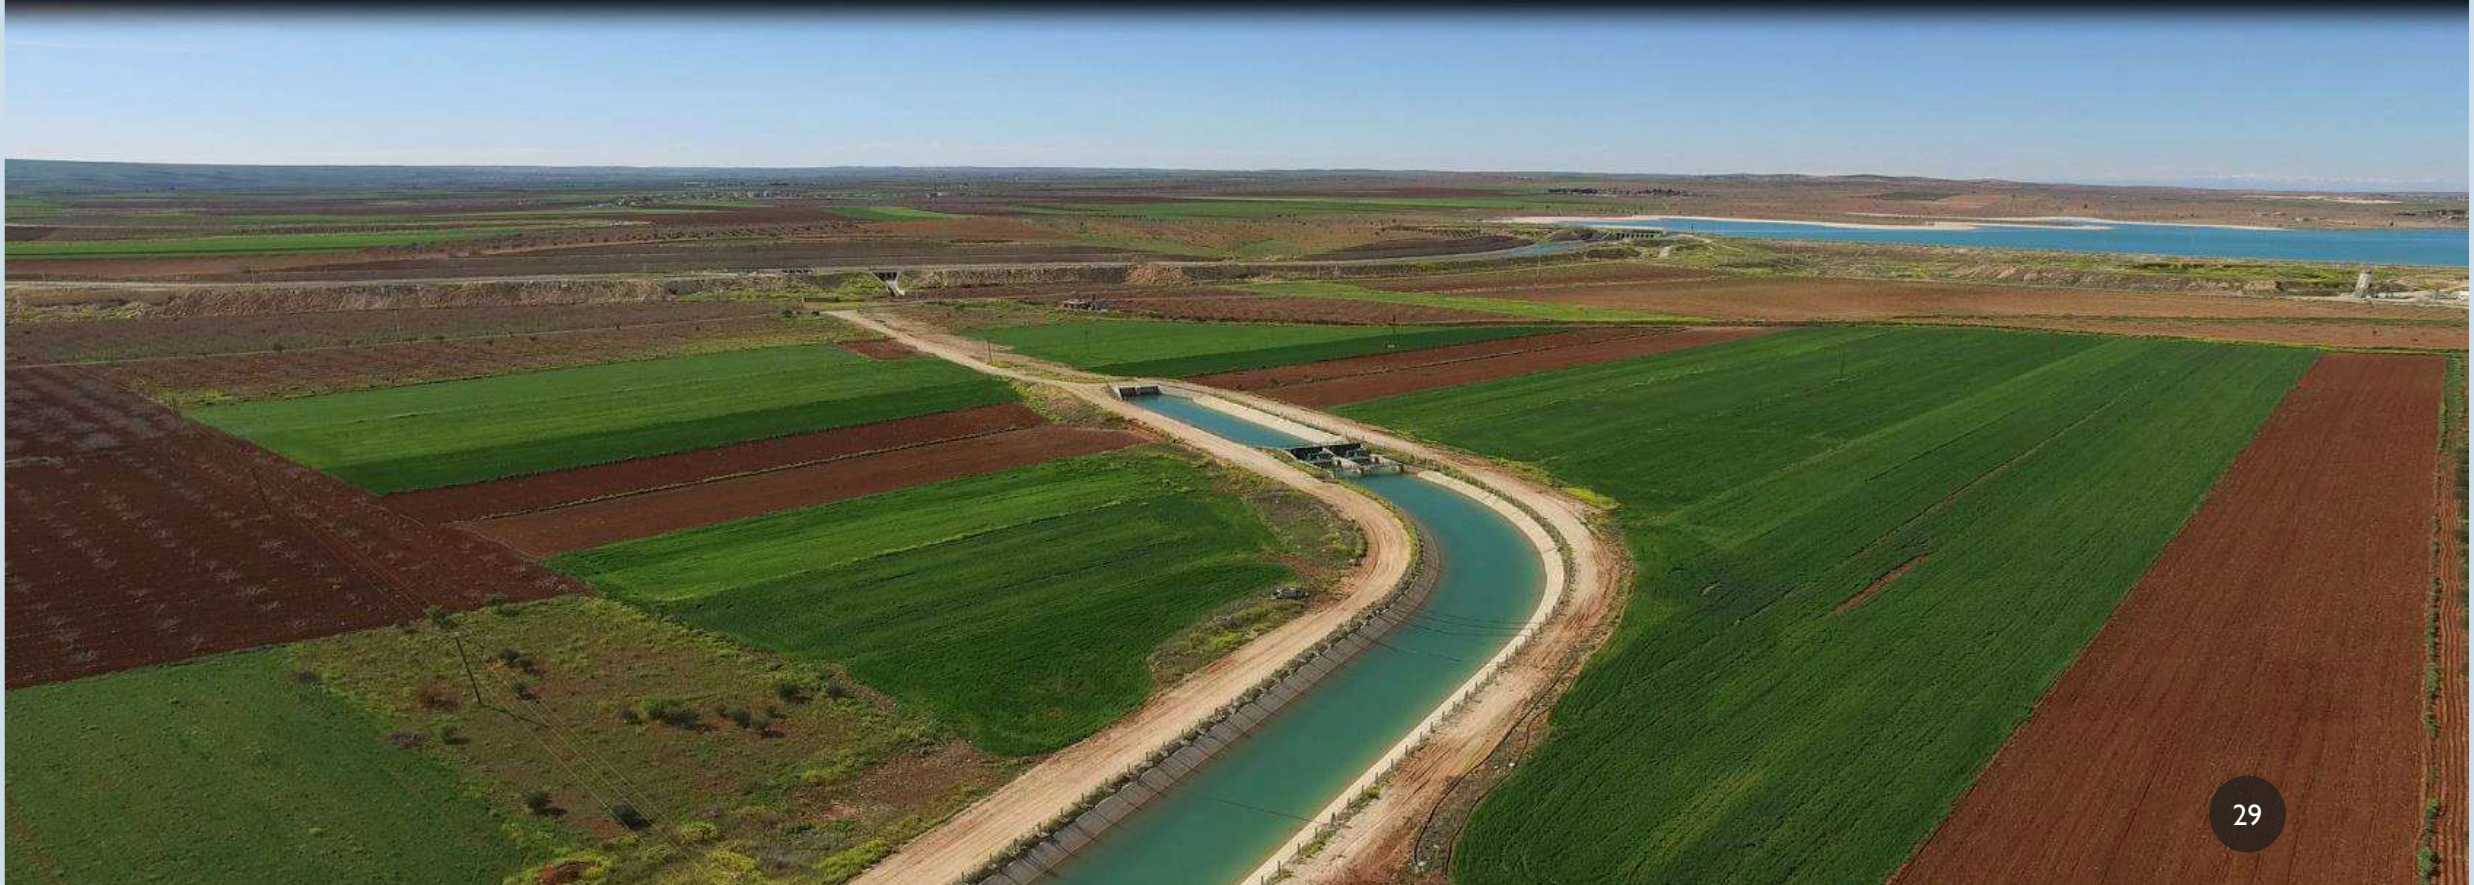

ŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMALARI PROJESİ

ŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMASI 2. KISIM ANA KANALI



- **İhale Tarihi** : 23.02.2010
- **İhale Bedeli** : 49 566 022 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 78
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 97
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 25.08.2013/31.12.2017
- **Proje Detayı** :Başlangıç Debisi 42,5 m³/s olan 43 850 m uzunluğunda ve başlangıç debisi 6,3 m³/s olan 31 073 m uzunluğunda, beton kaplamalı trapez kesitli açık kanallar ile üzerindeki sanat yapılarına ait inşaat işidir.



ŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMALARI PROJESİ

ŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMASI 2. KISIM ŞEBEKE 1. ÜNİTE




- **İhale Tarihi** : 19.11.2013
- **İhale Bedeli** : 84 481 405 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 80
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 69
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 17.02.2014/31.12.2017
- **Proje Detayı** :3 677 ha BP2-1, 4 871 ha BP2-2 ana kanalları altında olmak üzere toplam 8 548 ha tarım arazisinin sulanması için gerekli olan şebeke ve pompa istasyonu yapılacaktır.



ŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMALARI PROJESİ ŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMASI 2. KISIM ANA KANALI ALTINDA KALAN SAHALAR İLE TEKAĞAÇ SULAMASI



- **İhale Tarihi** : 07.02.2017
- **İhale Bedeli** : 14 920 000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 0
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 14.04.2017/16.10.2018
- **Proje Detayı** :26 749 ha araziye sulayacak olan Bozova Pompaj Sulaması 2.Kademe 2. Ünite işi kapsamında bulunan cazibe ile sulanabilecek 3 100 ha arazinin

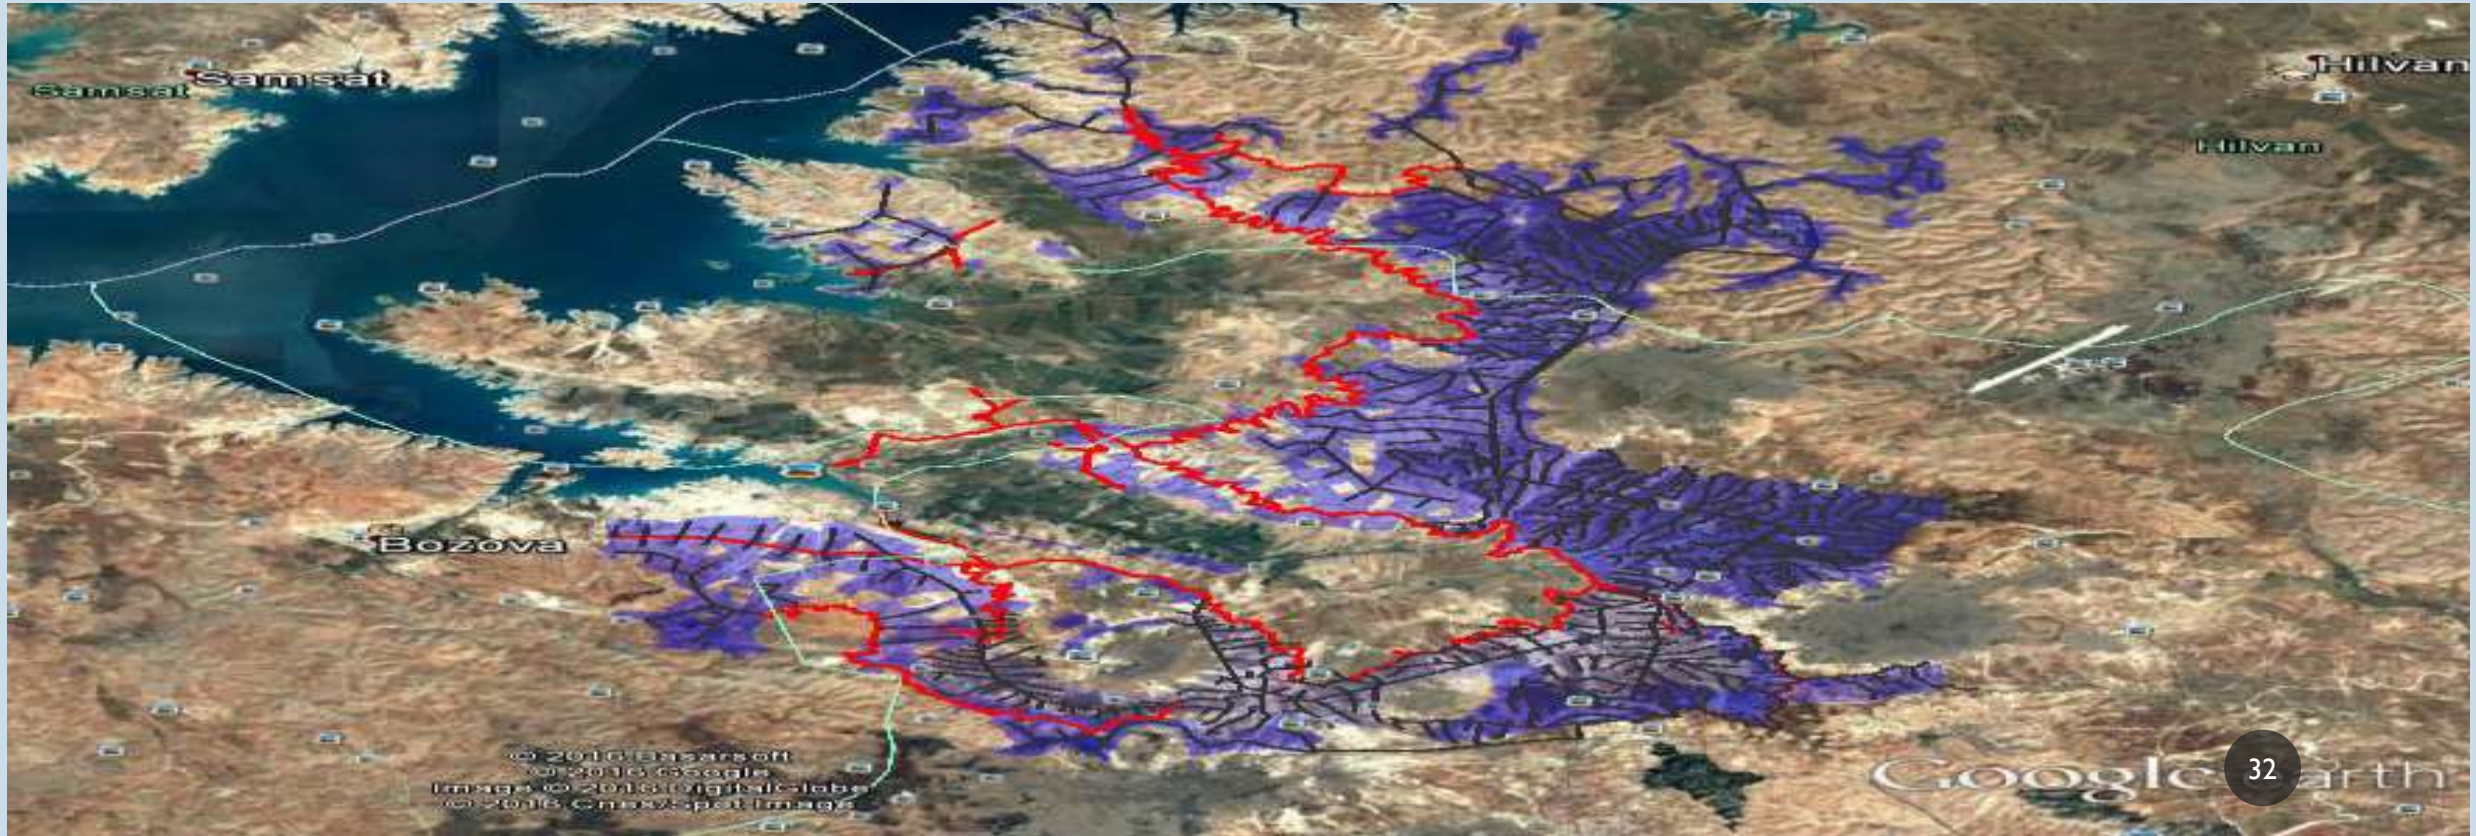

ŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMALARI PROJESİ

ŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMASI GÜNIŞİK ANA KANALI



- **İhale Tarihi** : 15.03.2010
- **İhale Bedeli** : 37 001 388,53 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**% 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 99
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 10.08.2010/31.12.2017
- **Proje Detayı** :40 414 m uzunluğunda trapez kesitli ana kanal ve 17 524 m uzunluğundaki ana boru hattı



ŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMALARI PROJESİŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMASI 3. KISIM ŞEBEKE İŞİ İŞLETME ÖNCESİ DEVREYE ALMA



- **İhale Tarihi** : 08.05.2017
- **İhale Bedeli** : 19 900 000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 26
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 2
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 12.06.2017/12.06.2020
- **Proje Detayı** :16 291 ha tarım arazisinin sulama ve drenaj şebekesinin yapılması



ATATÜRK BARAJI ÖLÇÜM ALETLERİNİN MODERNİZASYONU



- **İhale Tarihi** : 04.10.2016
- **İhale Bedeli** : 5 490 000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%55
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 14.07.2016/25.02.2019
- **Proje Detayı** :Atatürk Barajı ve HES tesislerinde yer alan ölçüm cihazlarının modernizasyonu, kalibrasyonları ve otomatik veri toplama sistemlerine bağlanması, internet üzerinden sonuçlara erişim yazılımının sağlanmasıdır.



SİVEREK İÇMESUYU İSALE HATTI



- **İhale Tarihi** : 08.03.2016
- **İhale Bedeli** : 58 429 750 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 60
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 5
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 07.11.2016/31.12.2018
- **Proje Detayı** :Siverek İlçesi ve 19 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar içme suyu İhtiyacı 1291.97 lt/sn.' dir. Suyun Atatürk Barajından karşılanması için yaklaşık 41 km. İsale Hattı ile Terfi merkezleri, depolar ve küçük sanat yapıları inşaatını kapsar.



SİVEREK İÇMESUYU ARITMA TESİSİ



- **İhale Tarihi** : 21.12.2016
- **İhale Bedeli** : 34 789 000TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 27
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 10.02.2017/10.02.2019
- **Proje Detayı** : Siverek İlçesi ve 19 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacı 1291.97 lt/sn. hem suyun artırılması için 110.000 m³/gün kapasiteli Arıtma Tesisi yapım işini kapsar.



ŞANLIURFA BİRECİK MEZRA GÖLETİ VE SULAMASI



- **İhale Tarihi** : 22.07.2013
- **İhale Bedeli** : 10 526 493,50 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 65
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 64
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 04.10.2013/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :260 ha tarım arazisinin sulanması için gerekli olan suyu depolamak ve buradan borulu şebeke sistemi ile suyu tarım arazilerine aktarmaktır.



ŞANLIURFA-SİVEREK NARLIKAYA GÖLETİ VE SULAMASI



- **İhale Tarihi** : 05.08.2013
- **İhale Bedeli** : 7367 916 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 94
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 01.11.2013/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :130 ha tarım arazisinin sulanması için gerekli olan suyu depolamak ve buradan borulu şebeke sistemi ile suyu tarım arazilerine aktarmaktır.



ŞANLIURFA SİVEREK TAŞIKARA GÖLETİ VE SULAMASI



- **İhale Tarihi** : 04.10.2013
- **İhale Bedeli** : 12 246 297 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%58
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 25.12.2013/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :305 ha tarım arazisinin sulanması için gerekli olan suyu depolamak ve buradan borulu şebeke sistemi ile suyu tarım arazilerine aktarmaktır.



ŞANLIURFA-SİVEREK UZUNCA GÖLETİ VE SULAMASI



- **İhale Tarihi** : 20.09.2013
- **İhale Bedeli** : 9 999 999 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 46
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 27.12.2013/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :205 ha tarım arazisinin sulanması için gerekli olan suyu depolamak ve buradan borulu şebeke sistemi ile suyu tarım arazilerine aktarmaktır.



ŞANLIURFA-SİVEREK KÜLHAN GÖLETİ VE SULAMASI



- **İhale Tarihi** : 13.08.2013
- **İhale Bedeli** : 12 414 169,31 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 94
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 08.11.2013/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :244 ha tarım arazisinin sulanması için gerekli olan suyu depolamak ve buradan borulu şebeke sistemi ile suyu tarım arazilerine aktarmaktır.



ŞANLIURFA SİVEREK DİLEKLİ GÖLETİ VE SULAMASI



- **İhale Tarihi** : 25.07.2013
- **İhale Bedeli** : 11 711 046,72 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 20
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 21.10.2013/ 31.12.2018
- **Proje Detayı** :171 ha tarım arazisinin sulanması için gerekli olan suyu depolamak ve buradan borulu şebeke sistemi ile suyu tarım arazilerine aktarmaktır.



ŞANLIURFA SİVEREK ERİCEK GÖLETİ VE SULAMASI



- **İhale Tarihi** : 28.08.2013
- **İhale Bedeli** : 6 698 461 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 7
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 23.12.2013/ 31.12.2018
- **Proje Detayı** :106 ha tarım arazisinin sulanması için gerekli olan suyu depolamak ve buradan borulu şebeke sistemi ile suyu tarım arazilerine aktarmaktır.



ŞANLIURFA-BİRECİK KARAKIZ GÖLETİ VE SULAMASI



- **İhale Tarihi** : 29.12.2016
- **İhale Bedeli** : 20 444 444 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 0
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 24.05.2017/ 06.07.2019
- **Proje Detayı** :134 ha tarım arazisinin sulanması için gerekli olan suyu depolamak ve buradan borulu şebeke sistemi ile suyu tarım arazilerine aktarmaktır.



ŞANLIURFA CAVSAK DERESİ 3. KISIM İNŞAATI



- **İhale Tarihi** : 21.06.2013
- **İhale Bedeli** : 7 316 787 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 65
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 09.12.2013/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :Şanlıurfa merkez cavsak deresi taşkın koruma işi



ŞANLIURFA BİRECİK TAŞKIN KORUMA İNŞAATI



- **İhale Tarihi** : 02.12.2013
- **İhale Bedeli** : 2 990 512,13 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 43
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 17.03.2014/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :Şanlıurfa Birecik İlçesi ve Köyleri taşkın koruma işi



ŞANLIURFA-HILVAN KORÇİK DERESİ



- **İhale Tarihi** : 17.12.2013
- **İhale Bedeli** : 2 348 815 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 93
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 13.03.2014/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** : Şanlıurfa Hilvan İlçesi taşkın koruma işi



ŞANLIURFA SIRRIN DERESİ MERKEZ MANSAP



- **İhale Tarihi** : 29.01.2016
- **İhale Bedeli** : 3 702 718 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 97
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 14.04.2016/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :Şanlıurfa Merkez Sırrın deresi taşkın koruma işi



CEYLANPINAR AŐAĐI VE YUKARI DORUKLU KÖYÜ



- **İhale Tarihi** : 28.01.2016
- **İhale Bedeli** : 3 454 163 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 94
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 08.04.2016/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :Şanlıurfa Ceylanpınar yukarı ve aşağı doruklu köyleri taşkın koruma işi



VİRANŞEHİR EYYÜPNEBİ, SATICIK VE SAKALAR KÖYLERİ



- **İhale Tarihi** : 27.01.2016
- **İhale Bedeli** : 5 524 999 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%89
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 12.04.2016/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnabi, satıcık ve sakalar köyleri taşkın koruma işi



ŞANLIURFA CEYLANPINAR MADEN KÖYÜ VE ANTEP DERESİ DEŞARJ KANALI



- **İhale Tarihi** : 16.06.2016
- **İhale Bedeli** : 874 362 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%80
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%84
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 01.08.2016/ 31.12.2017
- **Proje Detayı** :Şanlıurfa Ceylanpınar Maden Köyü ve Antep deresi taşkın koruma işi



MARDİN DEPOLAMASI



- **İhale Tarihi** : 25.03.2014
- **İhale Bedeli** : 187 408 948,53 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:% 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 24
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 02.10.2014 / 31.12.2018
- **Proje Detayı** : Atatürk Barajından sulama mevsimi dışında Şanlıurfa Tüneli, Yukarı Harran Ana Kanalı ve devamında Mardin Ana Kanalı vasıtasıyla alınacak suyun kanal sonundaki Pompa İstasyonu ile Mardin Depolamasına basılması ve yine aynı pompa istasyonu marifetiyle sulama mevsiminde Mardin Depolaması 1.2.3 kademe pompaj sulamalarına verilmesidir.



AŐAĐI FIRAT II. MERHALE PROJESİ MARDİN CEYLANPINAR OVALARI CAZİBE SULAMASI 3. KISIM ŐEBEKE



- **İhale Tarihi** : 20.03.2014
- **İhale Bedeli** : 117 685 540 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**: %100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %33
- **İşe Başlama / Bitiş Tarihi** : 27.06.2014 / 21.03.2019
- **Proje Detayı** : 16.333 ha tarım arazisinin sulama ve drenaj Őebekesinin yapılması




AŐAđI FIRAT II. MERHALE PROJESİ

MARDİN DEPOLAMASI CAZİBE SULAMASI ANA KANALI



- İhale Tarihi : 15.08.2016
- İhale Bedeli : 104 482 418 TL
- Nakdi Gerçekleşme Oranı:%0
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :%0
- İşe Başlama / Bitiş Tarihi : 24.02.2017 / 24.02.2019
- Proje Detayı :29 729 ha tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan ana kanal inşaatının yapılması

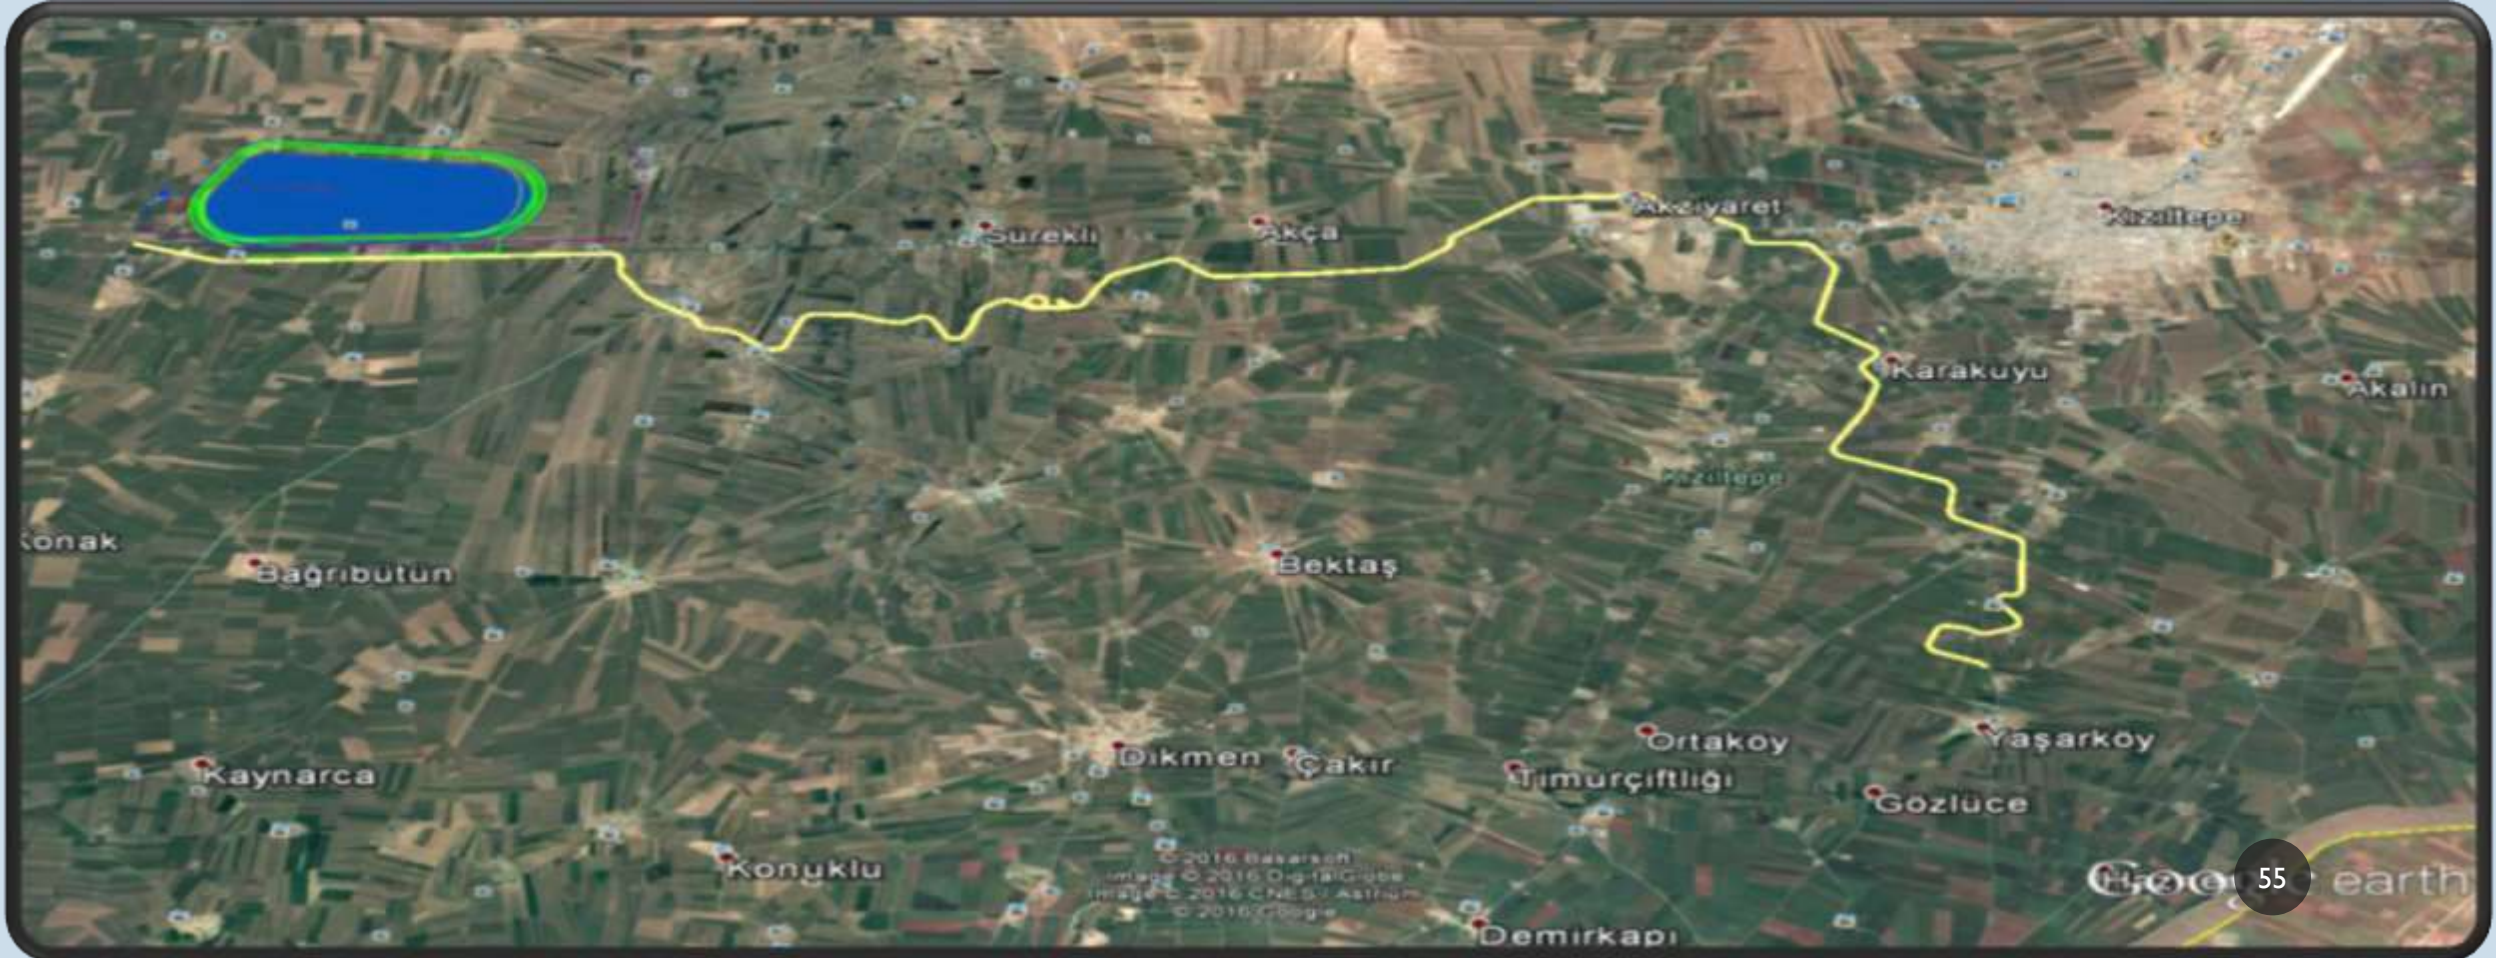

AŐAĐI FIRAT II. MERHALE PROJESİ MARDİN DEPOLAMASI CAZİBE SULAMASI



- İhale Tarihi : 14.02.2017
- İhale Bedeli : 182 812 728,15 TL
- Nakdi Gerçekleşme Oranı:%0
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :%0
- İşe Başlama / Bitiş Tarihi : 02.05.2017 / 30.07.2023
- Proje Detayı :29 729 ha tarım arazisinin sulama ve drenaj şebekesinin yapılması





ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN; **11** ADET DEVAM EDEN VE **5** ADET PLANLANAN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA **16** ADET YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

FUAR MERKEZİ PROJESİ



- İhale Tarihi : 5.05.2017
- İhale Bedeli : 23.673.000,00 TL
- Nakdi Gerçekleşme Oranı : 0%
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : 5%
- Başlama / Bitiş Tarihi : 19.06.2017 / 19.06.2018
- Proje Detayı : 20.000 m2 kapalı ve toplam 80.000 m2 alan üzerine yapılacak.



BİLİM MERKEZİ PROJESİ



- İhale Tarih : İhale Aşamasında
- İhale Bedeli :
- Nakdi Gerçekleşme Oranı :
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :
- Başlama / Bitiş Tarihi :
- Proje Detayı :



TENİS DÜNYASI PROJESİ



- İhale Tarihi : 13.02.2017
- İhale Bedeli : 4.337.500,00 TL
- Nakdi Gerçekleşme Oranı : 10%
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : 25%
- Başlama / Bitiş Tarihi : 20.03.2017 / 14.11.2017
- Proje Detayı : 4 Açık tenis kortu, 2 kapalı tenis kortu ve 1 çalışma sahası yer alacaktır.



11 NİSAN CAMİİ PROJESİ



- İhale Tarihi : 4.04.2017
- İhale Bedeli : 9.343.255,00 TL
- Nakdi Gerçekleşme Oranı : 0%
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : 5%
- Başlama / Bitiş Tarihi : 09.05.2017 / 02.08.2018
- Proje Detayı : Camii külliyesi ve üst geçidin temeli atıldı çalışmalar devam etmektedir.



TELEFERİK PROJESİ



- İhale Tarihi : 30.05.2017
- İhale Bedeli : -
- Nakdi Gerçekleşme Oranı : %0
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0
- Başlama / Bitiş Tarihi : -
- Proje Detayı : Haliliye Esentepe-Karaköprü Güzelşehir arasında yapılacak olan 2 km uzunluğuna sahip teleferik projesinin ihalesi yapıldı.



İKİZ YÜZME HAVUZU PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 20.03.2017
- **İhale Bedeli** : 4.666.000,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : 0%
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : 20%
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 26.04.2017 / 22.12.2017
- **Proje Detayı** : Haliliye ilçesinde 2 adet kapalı yüzme havuzu inşaat çalışmaları başladı.



TRAMBÜS PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 24.04.2017
- **İhale Bedeli** : 69.974.640,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : %
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %5
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 05.06.2017 /01.03.2018
- **Proje Detayı** : 4 Etaptan oluşacak olan projenin ilk etabı 7 km hat uzunluğuna sahip trambüs projesi; 63 nolu Balıklıgöl hattında çalışacak



KARAKÖPRÜ ÇOCUK OYUN DÜNYASI



- **İhale Tarihi** : 28.10.2016
- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : %50
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %50
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 2016-2017
- **Proje Detayı** : 30.000 m2 lik alan düzenlendi.



GAP VADİSİ 2. ETAP




- İhale Tarihi : 5.12.2016
- İhale Bedeli : 4.896.000,00 TL
- Nakdi Gerçekleşme Oranı : %70
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : %70
- Başlama / Bitiş Tarihi : 2016/2017
- Proje Detayı : 43.000 m2'lik alan düzenlendi.



GAP VADİSİ 3.ETAP (TÜNEL PARK)



- **İhale Tarihi** : 21.12.2016
- **İhale Bedeli** : 8.650.000,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : %40
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %40
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 2016/2017
- **Proje Detayı** : 43.000 m2'lik alan düzenlendi.

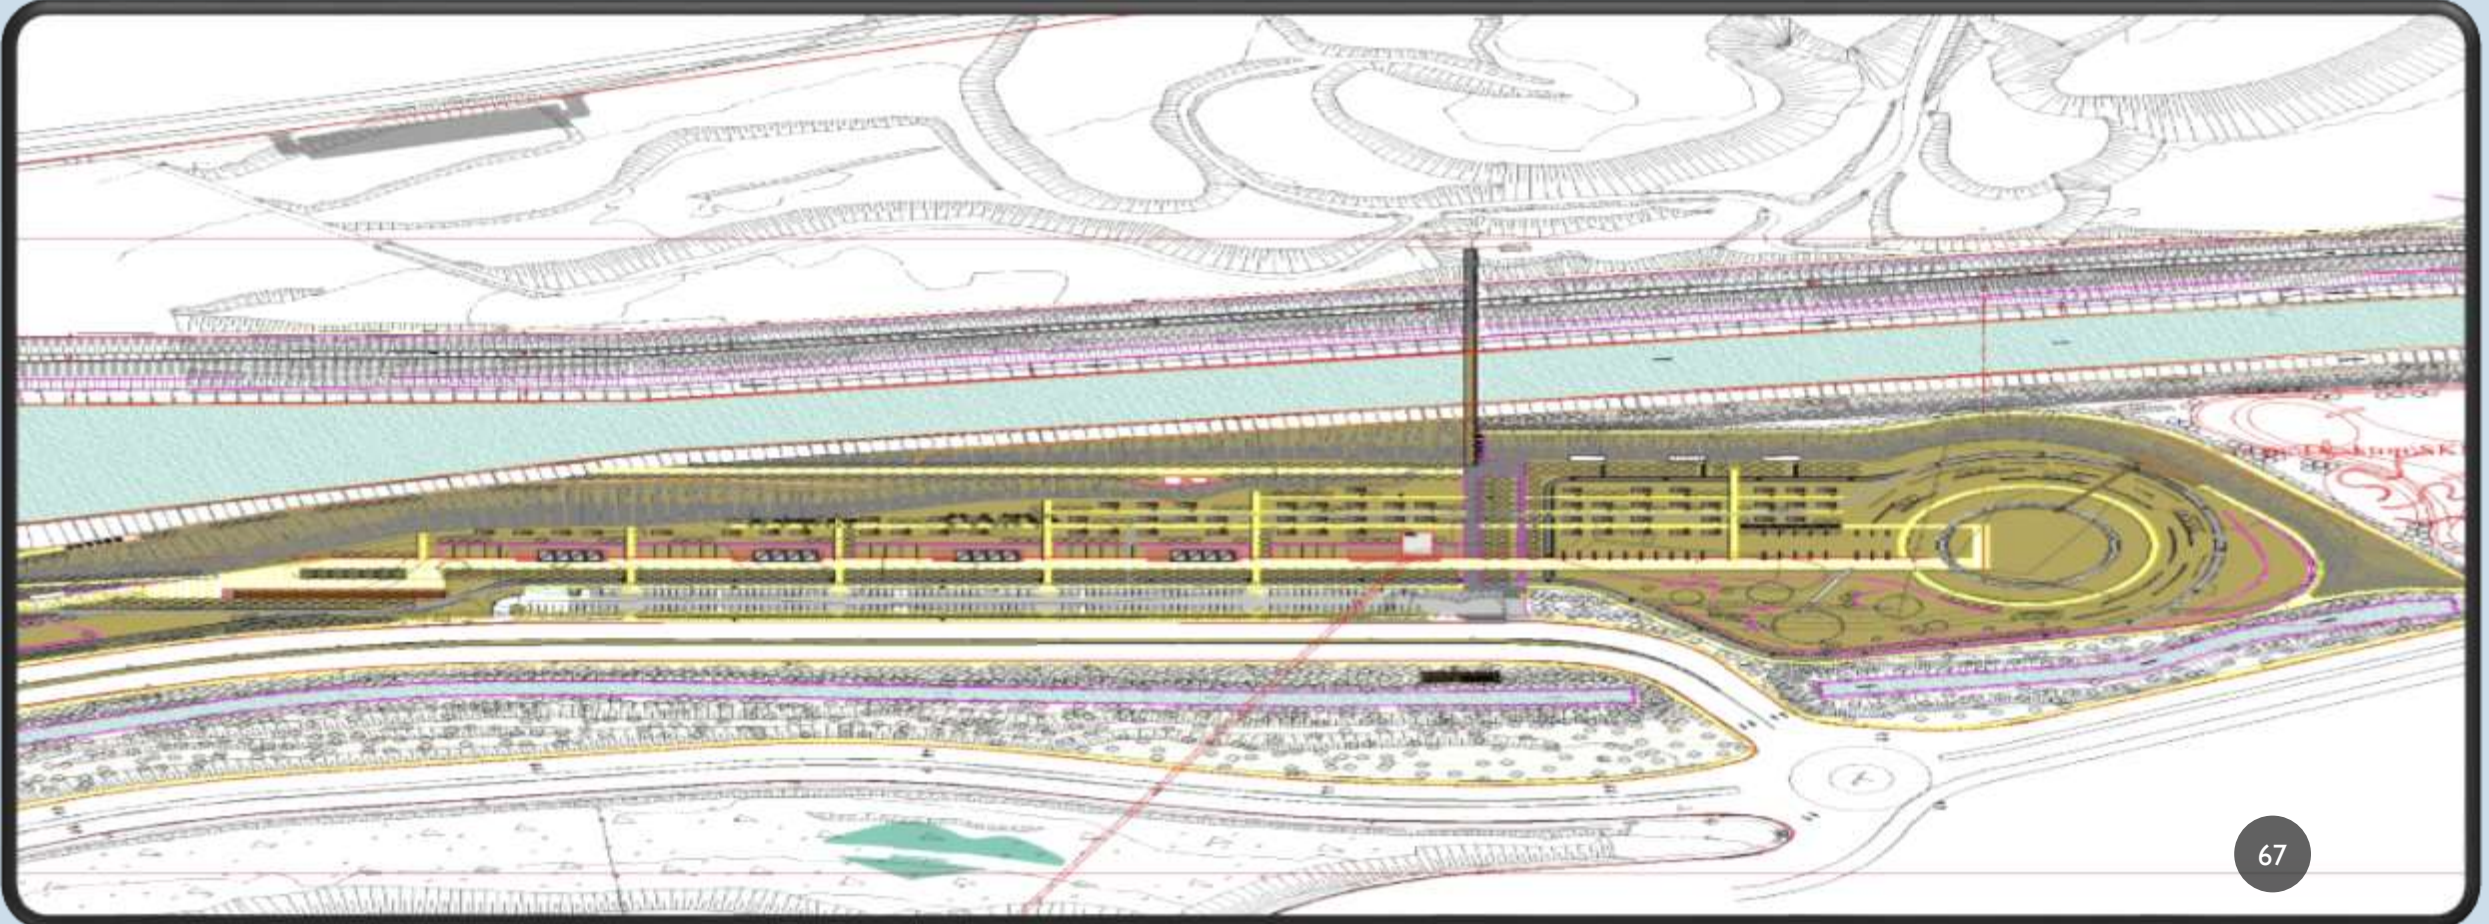

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU



- **İhale tarihi** :25.04.2015
- **İhale bedeli** :5.734.000,00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 98
- **Fiziksel Gerçekleşme Oranı** :% 95
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :25.08.2015/25.07.2017
- **Proje Detayı** :5 adet spor salonu mevcuttur.



CEYLANPINAR GENÇLİK MERKEZİ



- İhale tarihi :08.03.2017
- İhale bedeli :4.909.000,00
- Nakdi Gerçekleşme Oranı :% 5
- Fiziksel Gerçekleşme Oranı :% 5
- Başlama/Bitiş Tarihi :08.05.2017/12.06.2018
- Proje Detayı :Gençlik Merkezinde derslikler , kütüphane, bilgisayar vb. odalar mevcuttur.



PERSPEKTİFLER

AKÇAKALE GENÇLİK MERKEZİ



- **İhale bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziksel Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Akçakale ilçemize yapılacak olan “Gençlik Merkezi Yapım İşi” ihalesi 10.07.2017 tarihinde yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır.



HARRAN GENÇLİK MERKEZİ



- İhale bedeli :
- Nakdi Gerçekleşme Oranı :
- Fiziksel Gerçekleşme Oranı :
- Başlama/Bitiş Tarihi :
- Proje Detayı :Harran İlçemize Gençlik Merkezi yapılması amacı ile arazi tahsis ve proje çalışmaları devam etmektedir.

GM12 - 700 / A



TAM OLİMPİK YÜZME HAVUZU



- **İhale bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziksel Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** : I I Nisan Spor Kompleksimizin içerisinde yapılacak olan “Tam Olimpik Hüzme Havuzu İşi”nin zemin ve temel etüdü yapılmış olup, proje aşamasına geçilmiştir.



EYYÜBİYE GENÇLİK MERKEZİ



- İhale bedeli :
- Nakdi Gerçekleşme Oranı :
- Fiziksel Gerçekleşme Oranı :
- Başlama/Bitiş Tarihi :
- Proje Detayı :Eyyübiye İlçemize Gençlik Merkezi yapılması amacı ile arazi tahsis ve proje çalışmaları devam etmektedir.





İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 4 ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

SİVEREK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 16.11.2015
- **İhale Bedeli** : 7.800.000,00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 96
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 99
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 15.01.2016 / 08.06.2017
- **Proje Detayı** : Proje %99 seviyesinde tamamlanmış olup, Geçici Kabul aşamasındadır.



SİVEREK 48 DAİRELİ POLİS LOJMANLARI YAPIM İŞİ PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 27.10.2015
- **İhale Bedeli** : 8.200.000,00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 70
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 75
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 29.12.2015 / 26.04.2018
- **Proje Detayı** : Siverek İlçe Bölge Trafik İstasyon Amirliği yanında bulunan lojman inşaatı devam etmektedir.



HALFETİ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ PROJESİ



- İhale Tarihi : 29.01.2016
- İhale Bedeli : 2.686.000,00
- Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 95
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 99
- Başlama / Bitiş Tarihi : 16.03.2016 / 08.06.2017
- Proje Detayı : Proje %99 seviyesinde tamamlanmış olup, Geçici Kabul aşamasındadır.



VİRANŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE 96 DAİRELİ POLİS LOJMANLARI YAPIM İŞİ PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 11.06.2015
- **İhale Bedeli** : 17.670.000,00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 66
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 68
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 14.01.2016 / 02.01.2018
- **Proje Detayı** : Hizmet Binası ve Lojman Projesi % 68 seviyesinde tamamlanmış olup, kalan işlerle ilgili imalatlar devam etmektedir.





YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINA AİT; **2** ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

KÜLTÜR ADASI RESTORASYON UYGULAMA İŞİ



- İhale Tarihi :24.11.2016
- İhale Bedeli : 5.021.530,00
- Nakdi Gerçekleşme Oranı :%0
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :%10
- Başlama/Bitiş Tarihi :17.03.2017/17.09.2018



VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAM KONUTLARI YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :14.06.2017
- **İhale Bedeli** : 2.143.000,00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%62
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%90
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :3.04.2017 /11.07.2017





VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT; **10** ADET DEVAM EDEN VE **14** ADET PLANLANAN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA **24** ADET YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

EYYÜBİYE HALİL-ÜR RAHMAN CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Tarihi** :12.05.2015
- **İhale Bedeli** :835.000,00-TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**: %50
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %50
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :20.07.2015/ 27.07.2017
- **Proje Detayı** :Bilim Kurulu Hocaları direktifinde değerlendirme yapılmakta olup, sonucuna işlemlere yön verilecektir.



EYYÜBİYE FIRFIRLI CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Tarihi** :15.12.2015
- **İhale Bedeli** :837.818,50-TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:** % 64
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :** % 85
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :21.01.2016 / 05.10.2017
- **Proje Detayı** :Restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, çevre düzenlemesi devam etmektedir.



EYYÜBİYE ÇAMURLU MAHALLESİ CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Tarihi** :15.12.2015
- **İhale Bedeli** :341.910,13-TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**: % 100
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 85
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :21.01.2016 / 18.07.2017
- **Proje Detayı** :%15'lik kısımla ilgili Mukayeseli keşif çalışmaları devam etmektedir.



EYYÜBİYE NİMETULLAH CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Tarihi** :15.12.2015
- **İhale Bedeli** :828.457,55-TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**: %60
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %60
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 12.02.2016 / 03.09.2017
- **Proje Detayı** :Restorasyon çalışmalarında Cami kubbelerinin kurşun kaplanması aşamasına gelinmiş olup, Koruma Kurulunun önerisi doğrultusunda revize restorasyon proje hazırlıkları devam ediyor.



VİRANŞEHİR EYÜP NEBİ CAMİİ VE TÜRBEŞİ, ELYASAPEYGAMBER TÜRBEŞİ VE RAHİME HATUN TÜRBEŞİ RESTORASYONU



- **İhale Tarihi** :29.12.2015
- **İhale Bedeli** :913.943,86-TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:** % 35
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :** % 60
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 27.01.2016 / 25.04.2017
- **Proje Detayı** :Eyüpnebi Camii restorasyonu tamamlanmış olup, Elyasa Peygamber Türbesi ve Eyüpnebi Türbesinde restorasyon çalışmaları devam etmektedir.



HARRAN HAYATİ HARRANİ CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Tarihi** :13.12.2016
- **İhale Bedeli** :1.080.000,00-TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**: %4
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %20
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 23.02.2017 / 24.12.2017
- **Proje Detayı** :Koruma Kurulu Kararı gereğince müze denetiminde kazı çalışmaları ve kubbedeki beton tabakaların raspası tamamlandı. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan; Kripto odası(iç içe iki oda) projeye işlenerek, yeni proje Koruma Kuruluna gönderildi, onay aşamasına müteakip restorasyon çalışmalarına devam edilecektir.



EYYÜBİYE YARDIMCI KÖYÜ CABİR EL ENSAR CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Tarihi** :13.12.2016
- **İhale Bedeli** :910.000,00-TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:** % 27
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :** % 30
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 24.02.2017 / 26.12.2017
- **Proje Detayı** :Cabir-El Ensar Camii'ne ait restorasyon çalışmaları devam etmekte olup, çıkan yeni bulgular doğrultusunda Restorasyon projesi Revize edilerek, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiştir.



SİVEREK ULU CAMİ PROJE TEMİNİ



- **İhale Tarihi** :05.10.2016
- **İhale Bedeli** :88.000,00-TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**: %00
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %20
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 21.12.2016/ 17.10.2017
- **Proje Detayı** :Rölöve projeleri idaremizce değerlendirilmekte olup, inceleme neticesinde Koruma Kurulu onayına sunulacaktır.



SİVEREK GULALİBEY CAMİ PROJE TEMİNİ



- **İhale Tarihi** :05.10.2016
- **İhale Bedeli** :72.000,00-TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:** % 00
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :** % 20
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 21.12.2016/ 17.10.2017
- **Proje Detayı** :Rölöve projeleri idaremizce değerlendirilmekte olup, inceleme neticesinde Koruma Kurulu onayına sunulacaktır.



BİRECİK MAĞARA CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Tescilli Kültür Varlığı Eski Eser Birecik Mağara Cami Restorasyon ve çevre düzenlemesi ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.



EYYÜBİYE PAZAR CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Tescilli Kültür Varlığı Eski Eser Pazar Camii Kamulaştırma problemleri çözülmesine müteakip, Restorasyon çalışmalarına başlanacaktır.



EYYÜBİYE ESKİ ÖMERİYE CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Tescilli Kültür Varlığı Eski Eser Tescilli Eyyübiye Eski Ömeriye Cami Restorasyon ve çevre düzenlemesi yönünden değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.



EYYÜBİYE ÇARHOĞLU CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Tescilli Kültür Varlığı Eski Eser Çarhoğlu Cami Restorasyon ve çevre düzenlemesi yönünden değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.



EYYÜBİYE KADIOĞLU CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Tescilli Kültür Varlığı Eski Eser Kadıoğlu Cami Restorasyon ve çevre düzenlemesi yönünden değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.



EYYÜBİYE ESKİ SEFALİ CAMİİ RESTORASYONU



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Tescilli Kültür Varlığı Eski Eser Eyyübiye Eski Sefalı Cami Restorasyon ve çevre düzenlemesi yönünden değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.



VİRANŞEHİR KIŞLA CAMİİ PROJE TEMİNİ



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Tescilli Kültür Varlığı Eski Eser Viranşehir Kışla Cami Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri temini yönünden ihale çalışmaları devam etmektedir.



EYYÜBİYE HACI YADİGAR CAMİİ PROJE TEMİNİ



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Tescilli Kültür Varlığı Eski Eser Hacı Yadigar Cami Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri temini yönünden ihale çalışmaları devam etmektedir



EYYÜBİYE ÇAKERİ CAMİİ PROJE TEMİNİ



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Tescilli Kültür Varlığı Eski Eser Çakeri Cami Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri temini yönünden ihale çalışmaları devam etmektedir.



TİCARİ TESİS (Halı Saha ve Düğün Salonu)



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :

Proje Detayı :Merkez(Eyyübiye) ilçesi, Süleymaniye Mahallesi 4620 Ada 9-10 Parsel(Toplam İnşaat Alanı:6.381,30 m2) Toplam 4.697.685,00-TL Muammen bedel üzerinden (Yapım Karşılığı Kiralama İhalesi) İlanı çıkılmış olup, 17 Ağustos 2017 tarihinde ihalesi yapılacaktır.



KAT KARŞILIĞI-1

(Konut+Ticari)



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Merkez (Haliliye) ilçesi, Süleymaniye Mahallesi 4565 Ada 2 Parsel(Toplam İnşaat Alanı:8.914,50 m2) Avan projeye göre: toplam 98 Bağımsız bölüm olması planlanmaktadır. 7.470.351,00-TL Muammen bedel üzerinden İhale ilanına çıkılmış olup, 17 Ağustos 2017 tarihinde ihalesi yapılacaktır.



KAT_KARŞILIĞI-2

(Konut+Ticari)



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Merkez (Haliliye) ilçesi, Süleymaniye Mahallesi 4566 Ada 5 Parsel(Toplam İnşaat Alanı:1.740,00 m2) Avan projeye göre: toplam 17 Bağımsız bölüm olması planlanmaktadır. 1.458.120,00-TL Muammen bedel üzerinden İhale ilanına çıkılmış olup, 17 Ağustos 2017 tarihinde ihalesi yapılacaktır.



YAP-İŞLET DEVRET MODELİ (ÖZEL OKUL)



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Merkez (Haliliye) ilçesi, 1195 Ada 4 Parsel sayılı, 5.068,54 m2 yüzölçümlü Vakıf taşınmaz Yap-İşlet-Devret Modeli-Uzun Süreli Kiralama Modeli doğrultusunda ÖZEL OKUL olarak İhale edilmek üzere Ekspertiz çalışmalarına başlanılmıştır.



YAP-İŞLET DEVRET MODELİ (TİCARİ TESİS)



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :**
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Merkez (Eyyübiye) ilçesi, Kurtuluş Mahallesi 170 Ada 3-6-8 Parsel sayılı vakıf taşınmazlar (Toplam inşaat alanı: 14.077,49 m2) Yap-İşlet-Devret Modeli(Uzun Süreli Kiralama) kapsamında; Ticari Tesis yapılmak üzere; Proje ve Ekspertiz çalışmalarına başlanılmıştır.



YAP-IŞLET DEVRET MODELİ/KAT KARŞILIĞI MODELİ PAŞABAĞI OTO GALERİCİLER SİTESİ(ALIM SATIM)



- Merkez (Haliliye) ilçesi, Paşabağı Mahallesiinde Alım-Satım Oto Galericiiler olarak bilinen alanda ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan 20 adet vakıf (71.823,47 m2 yüzölçümlü) taşınmazların daha önce yapılmış olan uygulamalardan kaynaklı İmar problemleri büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuştur.
- Mevcutta kiracı yada işgalci bulunmayan yaklaşık 22.238,98 m2'lik alandaki vakıf taşınmazlarda; Özel Okul Projesi ve Yap-İşlet-Devret Modeli kapsamında Ticari Tesis projelerinin Ekspertiz çalışmalarına başlanmıştır. Bakiye yaklaşık 50 Dönümlük Fiilen işgalli yada kiracısı olan vakıf taşınmazların ise; Belediyesince yapımı devam eden yeni Oto Galericiiler sitesinin faaliyete geçmesine müteakip, kullanıcılardan arındırılması ile yatırım yönünden çalışmalara hız verilecektir.





KARAYOLLARI 9 . BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT; 16 ADET DEVAM EDEN VE 15 ADET PLANLANAN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 31 ADET YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

KAHTA-NARİNCE-SİVEREK YOLU (NİSİBİ KÖPRÜSÜ-SİVEREK ARASI, SİVEREK ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) KM:2+785-44+291,64 KESİMİNİN YAPIM İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 41,5 km BY BSK (Bölünmüş Yol Bitümlü Sıcak Karışım)
- **İhale Tarihi** : 03.07.2015
- **Proje Bedeli** : 198.656.306 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 16
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 15
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2016/2018
- **Proje Detayı** :
 - Toplam Uzunluğu 41.5 km olup 12 km lik kesimi Siverek Kuzey Çevre yolu niteliğindedir. 2016 yılı sonuna kadar 26.904 TL harcanarak 20 km.de toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları %90 seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.



DIYARBAKIR-SİVEREK- HILVAN YOLU 50+000 - 120+000



- **Uzunluğu ve Standardı** : 70 km BY SK>BSK (Bölünmüş Yol Sathi Kaplama Üzeri Bitümlü Sıcak Karışım)
 - **İhale Tarihi** : 21.09.2016
 - **Proje Bedeli** : 159.943.291 TL
 - **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 0
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 0
 - **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2017/2019
- Diyarbakır Hilvan Arası Toplam uzunluğu 120 km olup Diyarbakırdan başlamak üzere ilk 50 km si daha önce SK>BSK olarak tamamlanmıştır.
 - Geri kalan 70 km nin SK>BSK ihalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup 26/05/2017 tarihinde işe başlaması yapılmıştır.
 - Projede Bir adet Köprülü kavşak yer almaktadır.
 - Şantiye, Kônkasör ve Plent kurulumu yapılmakta olup 2017 yılı içerisinde yapıma başlanacaktır.
- **Proje Detayı**



KARABABA KÖPRÜSÜ YAPIM İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 2*395 m. Köprü Yapım
- **İhale Tarihi** : 16.02.2017
- **Proje Bedeli** : 65.000.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2017/2019

- **Proje Detayı** : Proje Uzunluğu 2 x 395 m olan Karababa Köprüsünün 12.06.2017 tarihinde işe başlama ve iş yeri teslimi yapılmış olup çalışmalara başlanılacaktır



ŞANLIURFA KUZEYBATI ÇEVRE YOLU KM:22+600-32+000 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPIM İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 10 km BY BSK (Bölünmüş Yol Bitümlü Sıcak Karışım)
- **İhale Tarihi** : 25.06.2015
- **Proje Bedeli** : 74.974.141 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 20
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 20
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2016/2018
- **Proje Detayı** :
 - Proje Uzunluğu 10 km olan yolda şuan itibariyle toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.



AKÇAKALE - CEYLANPINAR YOLU KM: 0+000-104+873 KESİMİNİN YAPIM İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 110 km TY SK (Tek Yol Sathi Kaplama)
- **İhale Tarihi** : 18.09.2012
- **Proje Bedeli** : 63.419.198 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 80
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 80
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2012/2017
- **Proje Detayı** :
 - Toplam uzunluğu 110 km. olan bu projede 61 km. TY-SK seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 2017 yılında 25 km'lik kesim bitirilerek trafiğe açılacaktır.



Ş.URFA-AKÇAKALE YOLU KM:0+000-11+500 ARASI VE KM:0+000-59+000 ARASI MUH. KES. KAVŞ İŞ. VE AKÇAKALE ÇEVRE YOLUNUN YAPILMASI



- **Uzunluğu ve Standardı** : 15 km BY SK>BSK (Bölünmüş Yol Sathi Kaplama Üzeri Bitümlü Sıcak Karışım)
- **İhale Tarihi** : 17.04.2013
- **Proje Bedeli** : 44.023.014 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 93
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 90
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2013/2017
- **Proje Detayı**
 - Şanlıurfa Akçakale Yolunun toplam uzunluğu 56 km olup BY SK iken Toplam uzunluğu 15 km. olan bu ihale ile projede 2016 yılı sonu itibari ile yolun 11 km'lik ve 2017 yılında 2,5 km olmak üzere toplamda 13,5 km lik kesim BY SK>BSK seviyesinde tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
 - Ayrıca bu iş bünyesinde 3 adet hemzemin kavşak imalatı gerçekleştirilmiştir.



(ŞANLIURFA-HİLVAN)AYR.-BOZOVA-8. BÖLGE HUDUDU YOLU KM:40+000-51+700 ARASI (KM:26+550 BOZOVA-ŞANLIAVŞAR KAVŞAĞI DAHİL) İKMAL, KM:51+700-53+500 ARASI KESİMDE (YENİ KARABABA KÖPRÜSÜ VARYANTI) TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPILMASI YAPIM İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 14 km BY SK (2*3) (Bölünmüş Yol Sathi Kaplama)
- **İhale Tarihi** : 24.03.2017
- **Proje Bedeli** : 36.500.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2017/2018
 - Şanlıurfa Bozova 8.Bölge Hududu yolu toplam 54 km olup 40 km si BY-SK 2X3 olarak önceki yıllarda tamamlanmıştır
- **Proje Detayı** :
 - İhale edilen Proje Uzunluğu 14 km olup BY SK 2X3 olarak projelendirilmiştir.
 - 30.06.2017 tarihinde işe başlanmış olup toprak işleri çalışmaları devam etmektedir.



HARRAN-HAN EL BAĞR-ÜR-SUAYBŞEHRİ-SOĞMATAR YOLU ARASI TEK YOL YAPILMASI



- **Uzunluğu ve Standardı** :51 km TY SK (Tek Yol Sathi Kaplama)
- **İhale Tarihi** :10.04.2012
- **Proje Bedeli** :35.938.394 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 85
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 85
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2012/2017
 - Toplam uzunluğu 51 km. olan bu projede 38 km. TY-SK seviyesinde tamamlanmıştır. 13 km'lik kesimde kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup kamulaştırma işlemlerin tamamlanması ile çalışmalara başlanılacaktır.
- **Proje Detayı**



TARİHİ BİRECİK BETONARME KEMER KÖPRÜSÜ RESTORASYON UYGULAMASI İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 689 m. Tarihi Köprü Onarımı
- **İhale Tarihi** : 21.08.2015
- **Proje Bedeli** : 27.917.169 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 93
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 93
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2015/2017
- **Proje Detayı** :
 - 1x689 mt uzunluğundaki Tarihi Birecik köprüsünde restorasyon uygulamaları devam etmektedir 2017 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.



BÖLGEMİZ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ TARİHİ ŞEYTANDERE, TARİHİ SKELE, TARİHİ ÜÇKÖPRÜ, TAŞHELVASI KÖYÜ I-II-III KÖPRÜLERİ, TARİHİ DAMLICA, TARİHİ ARASTUL, TARİHİ AHREÇKİ (TRABOĞUR), TARI BORE BOĞUR, TARİHİ HİSARKAYA, TARİHİ HACI AHMET AĞA (SÜRGÜCÜ AHMET AĞA) KÖPRÜLERİ RESTORASYON UYGULAMA İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 12 adet tarihi köprü onarımı 587 m.
- **İhale Tarihi** : 23.08.2016
- **Proje Bedeli** : 19.000.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : %45
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 45
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2016/2019

• Proje Detayı

- **Bu iş kapsamında 12 adet köprü bulunmaktadır.**
- **Diyarbakır ilinde;** Şeytan Deresi Köp.(60m), Tarihi İskele Köp.(24,86 m), Tarihi Üç Köp.(170,67 m), Taşhelvası Köp.I(35 m), Taşhelvası Köp.(23,64-27,09 m), Taşhelvası Köp.(25,73 m),
- **Şanlıurfa ilinde;** Tarihi Damlıca Köp.(30 m), Tarihi Arastul Köp.(82,24 m),
- **Mardin ilindeki;** Tarihi Akreçki Köp.(32,46 m), Tarihi Boreboğur Köp.(23,72 m), Tarihi Hisarkaya Köp.(35,86 m), Tarihi Sürgücü Ahmet Ağa Köp.(48,5 m)
- Taşhelvası Köyü (1-2-3) köprülerinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Şeytandere, Üç Köprü, Boreboğur, Traboğur köprülerinde restorasyon çalışmaları devam etmekte olup, diğer köprülerin restorasyon çalışmalarına 2017 yılı içerisinde başlanacaktır.



ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR -KIZILTEPE YOLU MUH. KM.LERDEKİ KAVŞAKLAR VE BAĞLANTI YOLLARININ T.İ ,S.Y VE Ü.Y İŞİ (İDARE MALİ BİTÜM İLE)



- **Uzunluğu ve Standardı** :3,5 KM BSK ONARIM (Bitümlü Sıcak Karışım Onarımı)
- **İhale Tarihi** :27.05.2014
- **Proje Bedeli** :12.460.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 64
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 64
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2014/2017
 - Toplam uzunluğu 3,5 km. olan bu kavşakların 2015 yılı itibariyle 2,3 Km.lik kesimi BSK Onarım olarak tamamlanmıştır. Bu güzergahta 5 adet kavşak bulunmaktadır.
 - Viranşehir Otogar (Ş.Urfa), Viranşehir OSB (Ş.Urfa) ve Kızıltepe Zahireciler (Mardin) Kavşağı tamamlanmış olup Aşağı Zok (Mardin) Kavşağının eksen solu tamamlanmıştır. 2017 yılında Aşağı Zok eksen sağ ve Soğukkuyu (Mardin) kavşağının tamamlanması hedeflenmektedir.
- **Proje Detayı**



ŞANLIYURFA-SURUÇ ARASI TAŞBASAN SULAMASI RÖLEKASYON YOLU

KM:0+000-6+132 ARASI YAPIM İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 6,3 km TY SK (Tek Yol Sathi Kaplama)
- **İhale Tarihi** : 18.02.2016
- **Proje Bedeli** : 5.184.503 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 2016/2017
- **Proje Detayı**
 - Toplam uzunluğu 6,3 km. olan bu yolda 12.05.2016 tarihinde işe başlaması yapılmıştır.
 - Toplulaştırma problemleri nedeniyle 2016 yılında çalışma yapılamamıştır. Toplulaştırma yapılarak kamulaştırma koridoru boşaltıldıktan sonra çalışmalara başlanıp kısa sürede tamamlanacaktır.



ŞANLIURFA ÇEVRE YOLU DİREKLİ DERE KÖPRÜSÜ, (K-1) KAVŞAĞI, (K-2) KAVŞAĞI, (K-4) KAVŞAĞI YAPIM İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 3 adet köprülü kavşak L: 2* (156 +156+ 129) ve L:2* 386 m Direkli Viyadüğü
- **İhale Tarihi** : 15.06.2017
- **Proje Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** : ➤ Bölge Müdürlüğümüzce 15.06.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir. 3 adet köprülü kavşak L: 2* (156 +156+ 129) ve L:2* 386 m Direkli Viyadüğü yer almaktadır.



SURUÇ-11 NİSAN ŞEHİR GEÇİŞİ KM:0+000-4+000 ve BİRECİK ŞEHİR GEÇİŞİ KM:0+000-2+000 ARASI MUHTELİF KESİMLERDE TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI ve ÜSTYAPI YAPILMASI İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 6 KM TY-SK>BSK (Tek Yol Sathi Kaplama Üzeri Bitümlü Sıcak Karışım)
- **İhale Tarihi** : 25.04.2017
- **Proje Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** : ➤ 25.04.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir.



ŞANLIURFA-HİLVAN YOLU MUHTELİF KİLOMETRELERDEKİ KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPILMASI İŞİ (İADRE MALİ BİTÜM İLE)



- **Uzunluğu ve Standardı** :4,5 KM BY-SK>BSK (Bölünmüş Yol Sathi Kaplama Üzeri Bitümlü Sıcak Karışım)
- **İhale Tarihi** :07.06.2017
- **Proje Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :
 - 07.06.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir. 4,5 km toplam uzunluğunda yol üzerinde 5 Adet Kavşak yer almaktadır



SURUÇ-AKÇAKALE YOLU (SURUÇ ÇEVRE YOLU DAHİL) VE MÜRŞİTPINAR BAĞLANTI YOLU



- **Uzunluğu ve Standardı**

25 Km BY-BSK (Bölünmüş Yol Bitümlü Sıcak Karışım)

53 Km TY-SK (Tek Yol Sathi Kaplama)

- **İhale Tarihi**

:

- **Proje Bedeli**

:

- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**

:

- **Fiziki Gerçekleşme Oranı**

:

- **Başlama/Bitiş Tarihi**

:

- **Proje Detayı**

- Proje uzunluğu 78 km. (25 km BY BSK 53 km TY SK) olan bu projenin plan profili onaylı olup Uygulama projesi devam etmektedir.
- Sari İhale yetkisi alınmış olup ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 2017 yılı içinde ihale edilecektir



ŞANLIURFA -11 NİSAN-BİRECİK YOLU




- **Uzunluğu ve Standardı** : 70 km. BY BSK (Bölünmüş Yol Bitümlü Sıcak Karışım)
 - **İhale Tarihi** :
 - **Proje Bedeli** :
 - **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
 - **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- Mevcut yol uzunluğu 75 km olan yol önceki yıllarda 11 km. si BY BSK seviyesinde tamamlanmıştır.
 - BY BSK (70 km.) olarak proje ihalesi Genel Müdürlüğümüzce henüz yapılmış olup çalışmalara başlanacaktır.
 - 2017 yılı yatırım programında yer almamaktadır.
 - Yatırım Programına teklif edilmiştir.
- **Proje Detayı** :



BİRECİK ÇEVRE YOLU (BİRECİK ÇEVRE YOLU KÖPRÜSÜ VE DDY KÖPRÜSÜ DAHİL)



- **Uzunluğu ve Standardı** : 2x574 m. (köprü)
: 2x32 m. (köprü) ve 10,6 Km BY BSK
- **İhale Tarihi** :
- **Proje Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** : 10,6 Km BY BSK yolun yatay düşey projesi onaylı olup kesin proje çalışmaları devam etmektedir.
: Ayrıca; köprülerin toplam proje uzunluğu 2x606 m.dir. Köprü Projeleri Genel Müdürlüğümüzce onaylıdır.
ihalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

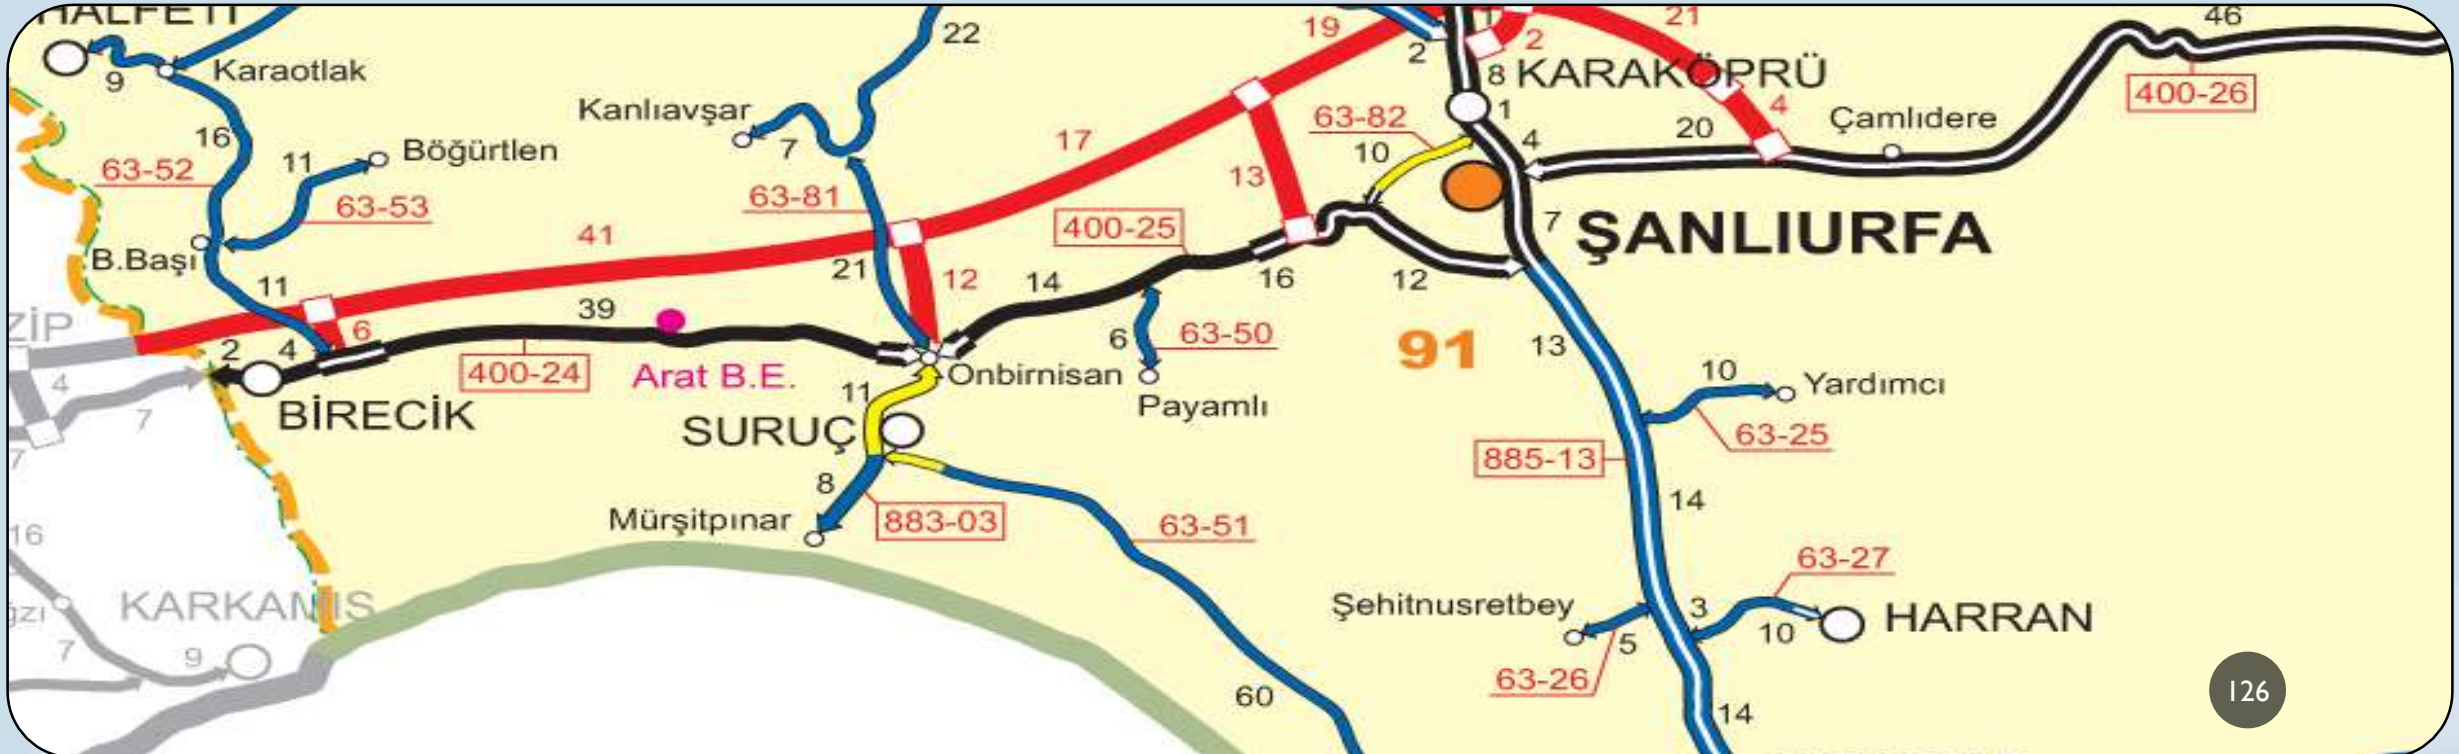

VİRANŞEHİR ÇEVRE YOLU BSK YAPILMASI



- **Uzunluğu ve Standardı** : 22 km BY BSK (Bölünmüş Yol Bitümlü Sıcak Karışım)
- **İhale Tarihi** :
- **Proje Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :
 - Proje uzunluğu 13 km. olan Viranşehir Çevreyolu yolunda güzergah kamulaştırma maliyeti nedeniyle uygulanabilirliğini yitirmiştir. Bu güzergah yerine uzunluğu 22 km. olan kılavuz planı onaylanmış olup Proje çalışmalarına başlanmıştır.



SİVEREK GÜNEY ÇEVRE YOLU BSK YAPILMASI



- **Uzunluğu ve Standardı** :21 km BY BSK (Bölünmüş Yol Bitümlü Sıcak Karışım)
- **İhale Tarihi** :
- **Proje Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :
 - Siverek ilçesini tam bir ring olarak çevreleyen Siverek Çevre yolunun uzunluğu 33 km'dir.
 - 12 km lik Kuzey çevre yolu Siverek Nissibi yolu ile beraber ihale edilmiştir.
 - 21'lik Siverek Güney Çevre yolunun proje çalışmaları devam etmektedir.



(Ş.URFA-AKÇAKALE YOLU KM:11+500-59+000 ARASI BSK YAPILMASI (MUH KAVŞAKLAR DAHİL)



- **Uzunluęu ve Standardı** : 48 km. BY SK>BSK (Bölünmüş Yol Sathi Kaplama Üzeri Bitümlü Sıcak Karışım)
 - **İhale Tarihi** :
 - **Proje Bedeli** :
 - **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
 - **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- Toplam uzunluęu 59 km olan yolun 11 km. si 2017 yılına kadar SK>BSK seviyesinde tamamlanmıştır. Geriye kalan 48 km.'lik kesim için SK>BSK proje çalışmalarına başlanmış olup (yatay düzey onaylıdır)
- **Proje Detayı** : devam etmektedir.
 - Üzerinde bulunan 17 adet (13 adet hemzemin -4 adet köprülü kavşak) kavşakların proje çalışmaları devam etmektedir.



KIZILTEPE-CEYLANPINAR YOLU YAPIM İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 63 km. TY SK (Tek Yol Sathi Kaplama)
- **İhale Tarihi** :
- **Proje Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :
 - Toplam uzunluğu 63 km olan Kızıltepe-Ceylanpınar yolunun 20 km'si Şanlıurfa ili, 43 km'si ise Mardin ili sınırları içerisinde kalmaktadır. Yolun plan profili Genel Müdürlüğümüzce onaylıdır. Uygulama proje çalışmalarına başlanmıştır. Kamu Yararı Kararı alınmış değerlendirme aşamasına geçilmiştir.
 - Yatırım programında yer almaktadır.



ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 1-2-3 KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI



- **Uzunluğu ve Standardı** : 3 Adet Köprülü Kavşak Toplam 300 m.
- **İhale Tarihi** :
- **Proje Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** : ➤ Proje çalışmalarına devam etmektedir.



YAYLAK – ADIYAMAN AYR. BOZOVA YOLU İKMAL



- **Uzunluğu ve Standardı** :9,8 Km. TY SK (Tek Yol Sathi Kaplama)
 - **İhale Tarihi** :
 - **Proje Bedeli** :
 - **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
 - **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- Halfeti Adıyaman ayrımı-Bozova arası 50,5 km yolun 44.5 km sinin yapımı ihaleli olarak devam etmekte olup kamulaştırma nedeniyle girilememiş 3,8 km.lik kesim ile birlikte taahhüde bağlanmamış 6 km' nin ihale edilerek yapılması ile yol bütünlüğü sağlanacaktır .
- 2017 yılı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.



OSMAN BEY KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI YAPIM İŞİ



- **Uzunluğu ve Standardı** : 40 m. Köprülü Kavşak
- **İhale Tarihi** :
- **Proje Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :
 - Osmanbey Köprülü Kavşağının proje uzunluğu 40 m.'dir. Proje çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince hazırlanmaktadır.



SİVEREK KUZEY ÇEVRE YOLU ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR



- **Uzunluğu ve Standardı** : 4 Adet Köprülü Kavşak Toplam 200 m.
 - **İhale Tarihi** :
 - **Proje Bedeli** :
 - **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
 - **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
 - **Başlama/Bitiş Tarihi** :
-
- **Proje Detayı**
 - 4 adet köprülü kavşağın toplam proje uzunluğu 200 m'dir.
 - İhale yapılabilmesi için Genel Müdürlüğümüzden Sari İhale Yetkisi alınmış olup projeler onaylanmıştır. İhale hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.





İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT; **1** ADET DEVAM EDEN VE **5** ADET PLANLANAN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA **6** ADET YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

ŞANLIURFA İL HALK KÜTÜPHANESİ PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 30.09.2015
- **İhale Bedeli** :898.891.10 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**: % 95
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 98
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :27.10.2015 / 07.11.2016
- **Proje Detayı** : Bakım onarımına ait Geçici kabulü yapılmış olup, iç düzenleme ve tefrişat ihalesi yapılacaktır.



ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ PROJESİ



- İhale Tarihi :19.04.2017
- İhale Bedeli : 57.975.00 t1
- Nakdi Gerçekleşme Oranı:
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :
- Başlama / Bitiş Tarihi : 03.07.2017 / 05.09.2017
- Proje Detayı : Proje çizimi devam etmekte olup, 2017 yılı içinde uygulama ihalesine geçilecektir.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi



ŞANLIURFA İL HALK KÜTÜPHANESİ İLE ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ ARASINA YAPILACAK OLAN KÖPRÜ KÜTÜPHANE PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 19.04.2017
- **İhale Bedeli** : 40.000.00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :03.07.2017 / 05.09.2017
- **Proje Detayı** : Proje çizimi devam etmekte olup, 2017 yılı içinde uygulama ihalesine geçilecektir.



HARRAN 263 PARSEL KÜMBET EV RESTORASYONU VE BUTİK OTEL DÖNÜŞÜM PROJESİ




- **İhale Tarihi** : 29.05.2017
- **İhale Bedeli** : 37.000.00 t1
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 29.05.2017 / 29.08.2017
- **Proje Detayı** : Projeler çizilmiş olup Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü onayına sunulmuştur
Kurul onayına müteakip uygulama işine geçilecektir.



ŞANLIURFA KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 13.07.2012
- **İhale Bedeli** : 116.000.00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :Şanlıurfa Kültür merkezi Binası Projelerinin çizilmesi işi ; projeler çizilmiş olup Bakanlığımız onayına müteakip uygulama işine geçilecektir.



HARRAN ULU CAMİ RESTORASYON PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 08.07.2009
- **İhale Bedeli** : 276.000.00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :29.12.2009
- **Proje Detayı** :Rölöve restorasyon, Restitüsyon, Mühendislik projeleri çizilmiş olup 2017 yılında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.





ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT; **2** ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI



- **İhale Tarihi** : 17.05.2017
- **İhale Bedeli** : 6.110.000 TL (KDV Hariç)
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**%10
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : %25
- **Başlama /Bitiş Tarihi** :14.06.2017-25.12.2017
- **Proje Detayı** : Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğümüz hizmet binası 7.000n m2 kapalı alana sahip Bodrum + Zemin + 3 Kat olmak üzere yapımı devam etmektedir. Tamamlandığında aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.



İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI (İkmal İnşaatı)



- **İhale Tarihi** : 06.03.2017
- **İhale Bedeli** : 480.000 TL (KDV Hariç)
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:** %95
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı :** %95
- **Başlama /Bitiş Tarihi** : 06.04.2017-02.09.2017
- **Proje Detayı** : Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü Toplu Koruma ve Yangın İlk Müdahale Ekip Binasının kaba inşaatı 2016 yılında tamamlanmış , ince iş olarak tanımlanan ikmal inşaatı 2017 yılında verilen ödenekle tamamlanmıştır.





HARRAN ÜNİVERSİTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİNE AİT; **2** ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

- **Başlama Tarihi/ Bitiş Tarihi** : 2011-2019
- **İhale Bedeli** : 25.000.000,00
- **Nakdi Gerçekleştirme Oranı** : %
- **Fiziki Gerçekleştirme Oranı** : % 95
- **Proje Detayı** : 5560,69 m2 Kapalı Alan 25.000.000,00 Proje Bedeli



REKTÖRLÜK BİNASI



- **Başlama Tarihi/ Bitiş Tarihi** : 2011-2019
- **İhale Bedeli** : 11.000.000.00 TL
- **Nakdi Gerçekleştirme Oranı** : %
- **Fiziki Gerçekleştirme Oranı** : % 80
- **Proje Detayı** : 9872 m2 kapalı alan Proje Bedeli 11.000.000.00 TL



- İhale Bedeli :
- Nakdi Gerçekleşme Oranı :
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :
- Başlama / Bitiş Tarihi :Proje Aşamasında
- Proje Detayı : Proje Bedeli 25.000.000, TL



HR.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BESYO KAPALI SPOR SALONU VE STADYUM ZEMİNLERİNİN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :21.10.2016
- **İhale Bedeli** :793.600,00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%95
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%95
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :2016-2017
- **Proje Detayı** : Nakdi ve Fiziki Gerçekleştirmeleri %95 oranında tamamlanmıştır Proje kapsamında bu güne kadar Kapalı Yüzme Havuzu , Kapalı Spor Salonu, Stadyum ve Sporcu Konaklama ve Açık Hava Spor Tesisleri Yapılmıştır.



KAMPÜS ALT YAPI



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%93
- **Başlama / Bitiş Tarihi** :1994-
- **Proje Detayı** : Doğalgaz Dönüşümü Kampüs iç yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su İsale hattı Telefon hattı v.b- İşin Bitimine Kadar.





TEİAŞ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT; **4** ADET DEVAM EDEN VE **7** ADET PLANLANAN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA **11** ADET YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

KARAKÖPRÜ TM PROJESİ



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2017 - 2018
- **Proje Detayı** :154/33 kV, 100+50 MVA Etüt - Proje
Aşamasında



ODAŞ DGKÇS - KIRLIK EİH YENİLEME PROJESİ



- **İhale Tarihi** :
- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2015 – 2018
- **Proje Detayı** :154 kV, 1272 MCM60 km. Etüt - Proje Aşamasında



ATATÜRK 380 TM TEVSIYAT PROJESİ



- **İhale Tarihi** :
- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2015 – 2018
- **Proje Detayı** :380 / 154 kV , 250 MVA Trafo + 380 kV , 1 Fider (Bank Fideri) + 154/33 V , 50 MVA Trafo + 154 kV , 2.Trafo Fideri + OG Metal Clad Binası



HİLVAN - VİRANŞEHİR 380 EİH YENİLEME PROJESİ



- **İhale Tarihi** :15.07.2015
- **İhale Bedeli** :7.466.032,00 USD
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%58
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2010 - 2017
- **Proje Detayı** :380 kV, 3B 954 MCM 91.84 km



SİVEREK - KARAKAYA EİH YENİLEME PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 25.08.2016
- **İhale Bedeli** :10.246.000,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%61
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2016 - 2019
- **Proje Detayı** :154 kV, 1272 MCM61 km.



BİRECİK BACK TO BACK SİSTEMİ PROJESİ



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2015 - 2018
- **Proje Detayı** :380kV 600 MVA,380/154 kV 2x250 MVA Etüt - Proje Aşamasında



ATATÜRK 380 - ADIYAMAN TM EİH YENİLEME PROJESİ



- **İhale Tarihi** :4.11.2015
- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%93
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2015 - 2017
- **Proje Detayı** :154 kV, 2x1272 MCM ,12 km+1272MCM,34 km.



BİRECİK TM TEVSIAT PROJESİ



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2011 - 2018
- **Proje Detayı** :154 kV, 1 Fider (Belkıs) + OG Metal Clad ve Kumanda Binası. Etüt - Proje Aşamasında



ŞANLIURFA 1 TM TEVSIAT PROJESİ



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:%0**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2013 - 2018
- **Proje Detayı** :Etüt - Proje Aşamasında. 154 kV , Bara Yenileme , Metal Clad OG şalt ve kumanda binası



PEKMEZLİ TM TEVSIYAT PROJESİ



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2017 - 2018
- **Proje Detayı** :Etüt - Proje Aşamasında 154/33 kV , 100 MVA trafo + 154 kV , 2 Fider (3.ve 4.Trafo) + OG Şalt İlavesi



TELHAMUT TM TEVSİAT PROJESİ



- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :2017 - 2018
- **Proje Detayı** :Metal Clad Bina. Etüt - Proje Aşamasında





SİVEREK KAYMAKAMLIĞI

SİVEREK KAYMAKAMLIĞININ **1** ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

SİVEREK ADLİYE SARAYI PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 24/10/2016
- **İhale Bedeli** : 15.973.000,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:** % 25
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 25
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 01.01.2017 - 17.06.2018





İL MİLLİ EĐİTİM MÜDÜRLÜĐÜ

İL MİLLİ EĐİTİM MÜDÜRLÜĐÜNÜN; **14** ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

ŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİ BUHARA ORTAOKUL-İLKOKUL İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :11.01.2016
- **İhale Bedeli** :20.477.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 94,71
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 95,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :10.03.2016 - 31.08.2017
- **Proje Detayı** :103 Derslikli okul



ŞANLIURFA İLİ MERKEZ EYYÜBİYE İLÇESİ GÖLBAŞI ORTAOKUL-İLKOKUL İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :12.01.2016
- **İhale Bedeli** :18.490.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 87,42
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 93,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :01.03.2016 - 24.07.2017
- **Proje Detayı** :103 Derslikli okul



ŞANLIURFA İLİ MERKEZ HALİLİYE İLÇESİ 5100 ADA 1-2-3 PARSELLERDE MESLEKİ TEKNİK LİSE VE PANSİYONLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :24.01.2017
- **İhale Bedeli** :27.860.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 20,37
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 24,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :30.03.2017 - 23.05.2018
- **Proje Detayı** :24 - 32 Derslikli okul ve 200 kişilik pansiyonlar



ŞANLIURFA İLİ KARAKÖPRÜ İLÇESİ 5100 ADA 4-5 PARSELLERDE MESLEKİ TEKNİK LİSE VE PANSİYONLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :24.03.2017
- **İhale Bedeli** :15.493.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 5,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :28.06.2017 - 11.08.2018
- **Proje Detayı** :24 - 32 Derslikli okul ve 200 kişilik pansiyonlar



ŞANLIURFA İLİ MERKEZ HALİLİYE İLÇESİ 5100 ADA 6-7-8 PARSELLERDE ORTAÖĞRETİM LİSE, PANSİYON VE SPOR SALONU İNŞAATI YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :25.01.2017
- **İhale Bedeli** :28.790.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 14,99
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 18,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :30.03.2017 - 02.06.2018
- **Proje Detayı** :32 - 40 Derslikli okul ve 200 kişilik pansiyonlar



ŞANLIURFA İLİ HARRAN DAMLASU 24 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :24.01.2017
- **İhale Bedeli** :4.898.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 20,85
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 21,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :29.03.2017 - 28.12.2017
- **Proje Detayı** :24 Derslikli okul



ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ EFİKAP - 8 BATIKENT MAH. 24 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :7.12.2016
- **İhale Bedeli** :3.133.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 39,41
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 44,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :13.03.2017 - 27.12.2017
- **Proje Detayı** :24 Derslikli okul



ŞANLIURFA İLİ SİVEREK İLÇESİ 40 DERSLİKLİ MESLEK LİSESİ VE ATÖLYE YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :5.06.2015
- **İhale Bedeli** :12.450.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 79,11
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 85,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :25.01.2016 - 30.09.2017
- **Proje Detayı** :40 Derslikli okul



ŞANLIURFA SİVEREK İLÇESİ 607/1 PARSEL 32 DERSLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ, 200 KİŞİLİK PANSİYON VE ATÖLYE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ



- **İhale Tarihi** :23.12.2016
- **İhale Bedeli** :10.849.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 16,75
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 18,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :14.04.2017 - 18.05.2018
- **Proje Detayı** :32 Derslikli okul, 200 kişilik pansiyon ve atölye



ŞANLIURFA SİVEREK İLÇESİ 607/2 PARSEL 32 DERSLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ, 200 KİŞİLİK PANSİYON VE ATÖLYE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ



- **İhale Tarihi** :22.12.2016
- **İhale Bedeli** :10.797.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 9,51
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 18,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :05.04.2017 - 09.05.2018
- **Proje Detayı** :32 Derslikli okul, 200 kişilik pansiyon ve atölye



ŞANLIURFA SİVEREK İLÇESİ 607/3 PARSEL 32 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ VE 200 KİŞİLİK PANSİYON İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ



- **İhale Tarihi** :22.12.2016
- **İhale Bedeli** :9.975.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 13,14
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 20,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :26.04.2017 - 30.05.2018
- **Proje Detayı** :32 derslikli okul, 200 kişilik pansiyon



ŞANLIURFA SİVEREK İLÇESİ 607/4 PARSEL 24 DERSLİKLİ ANADOLU LİSESİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ



- **İhale Tarihi** :23.12.2016
- **İhale Bedeli** :3.590.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 11,14
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 19,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :22.03.2017 - 15.01.2018
- **Proje Detayı** :24 Derslikli okul



ŞANLIURFA İLİ VİRANŞEHİR HÜRRIYET MAHALLESİ ANAOKULU YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :22.03.2017
- **İhale Bedeli** :1.050.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 7,98
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 10,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :02.05.2017 - 7.11.2017
- **Proje Detayı** :Anaokulu



ŞANLIURFA İLİ VİRANŞEHİR SUGÖRÜNDÜ KÖYÜ 2 DERSLİKLİ 1 DAİRELİ LOJMAN İKMAL YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :28.03.2017
- **İhale Bedeli** :177.000,00 ₺
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :% 39,10
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 75,00
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :08.06.2017 - 05.09.2017
- **Proje Detayı** :2 Derslik ve 1 lojman





CEYLANPINAR TİGEM

CEYLANPINAR TİGEM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN; **4** ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

82 ADET (27.725 da) CENTER-PIVOT SULAMA SİSTEMİ TESİSİ İŞİ




- **İhale Tarihi** :04.11.2016
- **İhale Bedeli** :26.450.00,00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%44
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%72
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :02.01.2017/29.10.2017
- **Proje Detayı** : Mardin sulama kanalından alınacak suyla 27.725 dekar alanda basınçlı sulama sistemi (Center-Pivot) ile sulama yapılacak.



94 ADET (28.943 da) CENTER-PİVOT SULAMA SİSTEMİ TESİSİ İŞİ



- **İhale Tarihi** :26.06.2017
- **İhale Bedeli** :31.885.000,00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :31.07.2017/30.03.2018
- **Proje Detayı** : Mardin sulama kanalından alınacak suyla 28.943 dekar alanda basınçlı sulama sistemi (Center-Pivot) ile sulama yapılacaktır.

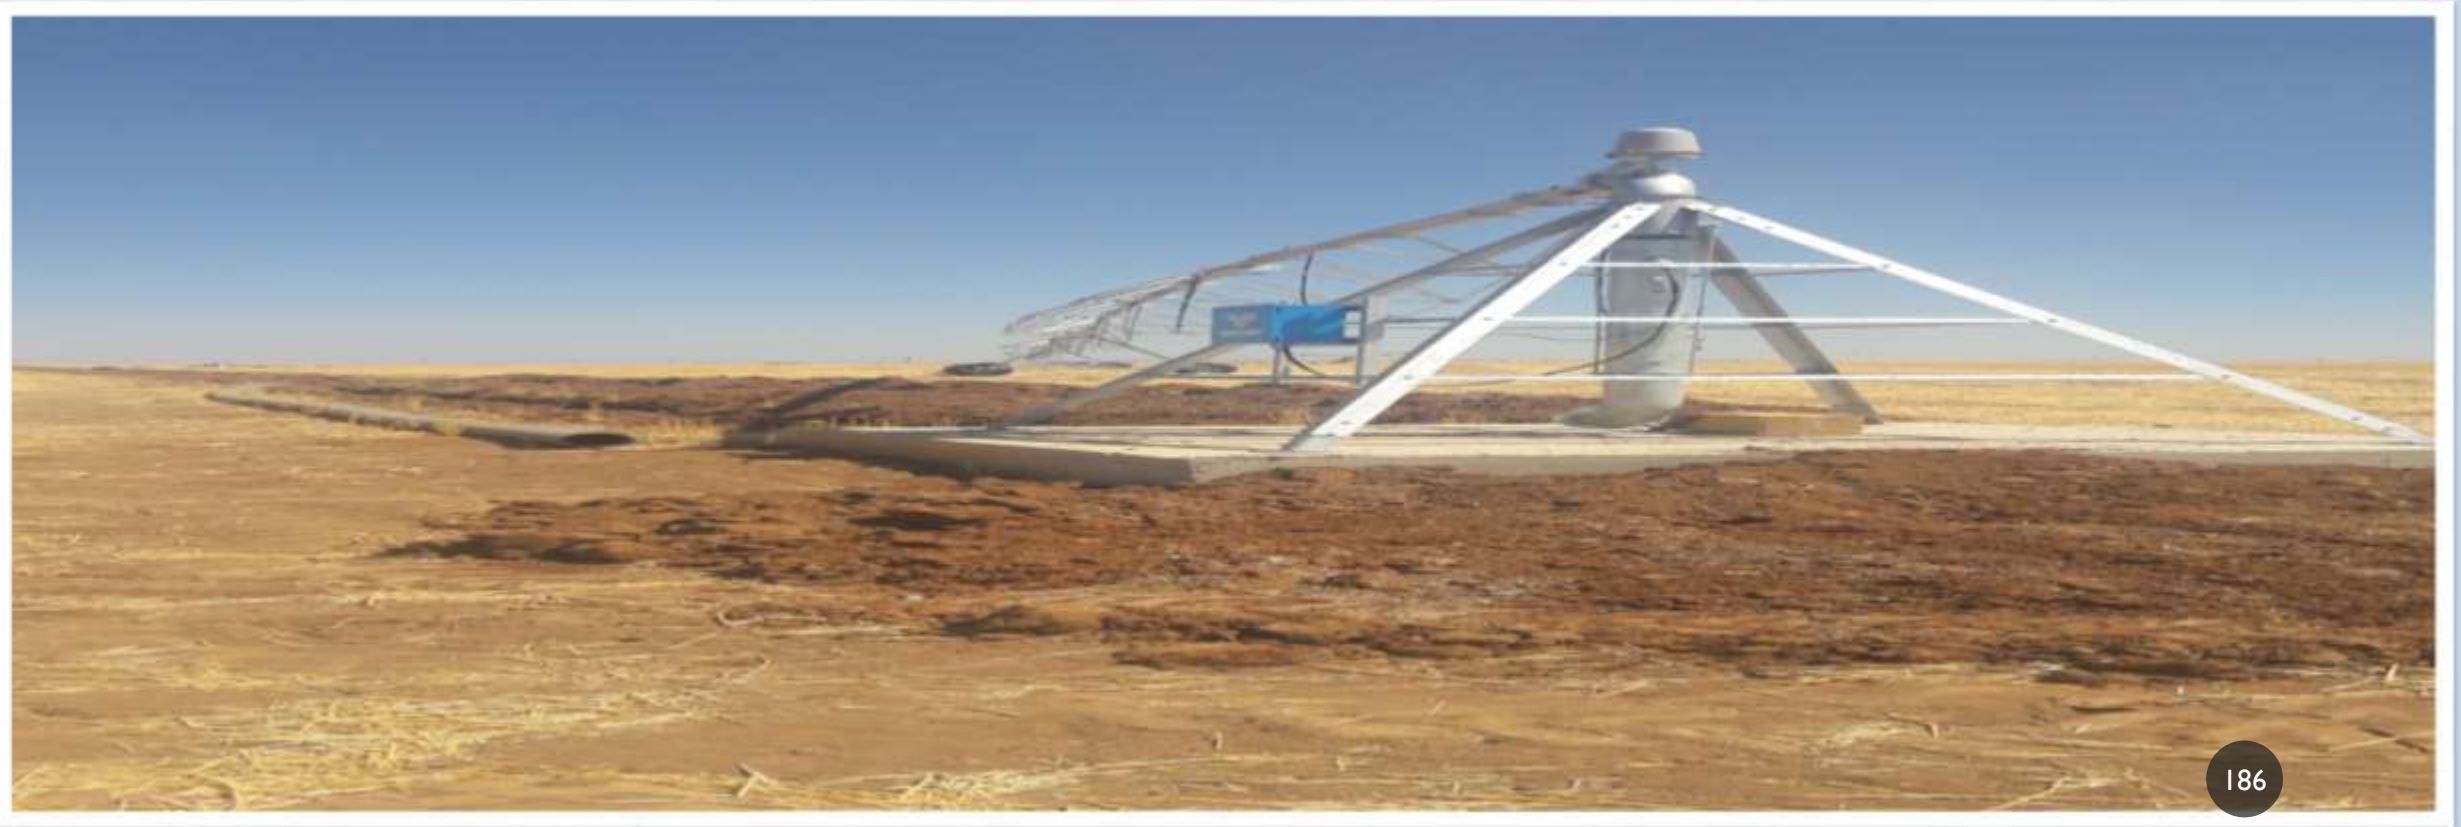

82 ADET (27.725 da) CENTER-PİVOT SULAMA SİSTEMİ TESİSİ İŞİ



- **İhale Tarihi** :04.11.2016
- **İhale Bedeli** :26.450.00,00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%44
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%72
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :02.01.2017/29.10.2017
- **Proje Detayı** : Mardin sulama kanalından alınacak suyla 27.725 dekar alanda basınçlı sulama sistemi (Center-Pivot) ile sulama yapılacak



ENH, MONOBİLİK KÖK BİNASI, KOMPANZASYON TESİSİ YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :27.04.2017
- **İhale Bedeli** :12.250.000,00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%5
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı**:%12
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :29.05.2017/04.12.2017
- **Proje Detayı** : 28.943 dekar alanda yapılacak basınçlı sulama sistemlerinin enerji ihtiyacı, projede yapımı tamamlanmış olan enerji nakil hatlarından sağlanacaktır.





AKÇAKALE BELEDİYESİ

AKÇAKALE BELEDİYESİNE AİT; 5 ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

AKÇAKALE BELEDİYESİ SENTETİK ÇİM SAHA YAPIM PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 31.05.2017
- **İhale Bedeli** : 344.000,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**: % 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 30
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 19.07.2017-20.11.2017
- **Proje Detayı** : İlçemiz akdiken ve öncül mahallerine 2 adet sentetik çim saha yapım işi



AKÇAKALE BELEDİYESİ PARK YAPIM İŞİ PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 09.06.2017
- **İhale Bedeli** : 516.000,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 0**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 40
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 28.07.2017-28.11.2017
- **Proje Detayı** : İlçe merkezinde Yenişehir mahallesinde 9.000 m2 alan ile fevzi çakmak mahallesi 4.320 m2 alan olmak üzere 2 adet park yapım işi



AKÇAKALE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 06.01.2017
- **İhale Bedeli** : 3.489.000,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 75
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 75
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 17.02.2017-17.11.2017
- **Proje Detayı** : Belediye hizmet binası yapımı (4600 m2 alan üzerine her katı 1200 m2 olmak üzere bodrum ve 3 kattan oluşmaktadır.)



AKÇAKALE BELEDİYESİ KREŞ BİNASI PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 03.02.2017
- **İhale Bedeli** : 1.599.000,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 30**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 65
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 30.03.2017-30.09.2017
- **Proje Detayı** : Kreş yapımı 1600 m2 alan üzerine 500 m2 bina oturumu ile 3 kattan oluşmaktadır. Yapılacak kreşte tiyatro salonu, oyun odaları, uyku odaları, faaliyet odaları, müzik odası, top havuzu ve trampolin olacaktır.



AKÇAKALE BELEDİYESİ ENGELLİ MERKEZİ PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 27.01.2017
- **İhale Bedeli** : 695.000,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**: % 65
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 30
- **Başlama/Bitiş Tarihi** : 13.04.2017
- **Proje Detayı** : Engelli merkezi yapımı işi 1500 m2 alan üzerine kurulmuş olup,2 kattan oluşmaktadır. Engellilerimizin son derece sosyal aktivitelerini yapabilecekleri tesise sahip olacaklar.





BİRECİK BELEDİYESİ

BİRECİK BELEDİYESİNİN **2** ADET DEVAM EDEN YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

KÜLTÜR MERKEZİ HAMAM VE SAUNA YAPIM İŞİ



- İhale Tarihi :22.12.2016
- İhale Bedeli :603.200.00 TL
- Nakdi gerçekleşme oranı :%35
- Fiziki Gerçekleşme oranı :%50
- Başlama / Bitiş Tarihi :18.1.2017 / 15.09.2017
- Proje Detayı :



BİRECİK İLÇESİ 11 ADET AÇIK VE KAPALI SEMT SAHASI YAPIMI



- İhale Tarihi :28.7.2017
- İhale Bedeli :2.096.500.00 TL
- Nakdi gerçekleşme oranı :
- Fiziki Gerçekleşme oranı :%10
- Başlama / Bitiş Tarihi :28.07.2017 / 27.01.2018
- Proje Detayı :





CEYLANPINAR BELEDİYESİ

CEYLANPINAR BELEDİYESİNE AİT; **3** ADET DEVAM EDEN VE **3** ADET PLANAN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA **6** YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

CEYLANPINAR BELEDİYESİ 200 KİŞİLİK KIZ ÖĞRENCİ YURDU PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 31.10.2016
- **İhale Bedeli** : 4.300.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 0**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 30
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 17.11.2016 / 17.11.2017
- **Proje Detayı** : Ceylanpınar Belediyesi Kendi Öz kaynakları ile çalışma yapmaktadır.



CEYLANPINAR BELEDİYESİ 4 BÜYÜK PARK PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 08.03.2017
- **İhale Bedeli** : 2.367.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : %21
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 30
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 20.03.2017 / 20.10.2017
- **Proje Detayı** : Ceylanpınar Belediyesi Kendi Öz kaynakları ile çalışma yapmaktadır.



CEYLANPINAR BELEDİYESİ ENSAR MAHALLESİ KÜLTÜR EVİ KAZANDIRMA PROJESİ



- **İhale Tarihi** : Kurum Kendi Hizmet alma / Satın Alma Yöntemiyle Çalışmaktadır.
- **İhale Bedeli** : 251.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : %59
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 60
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 01.06.2017 / Devam Ediyor
- **Proje Detayı** : Ceylanpınar Belediyesi Kendi Öz kaynakları ile çalışma yapmaktadır.



CEYLANPINAR BELEDİYESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ PARK PROJESİ



- **İhale Tarihi** : Kurum Kendi Hizmet alma / Satın Alma Yöntemiyle Çalışmaktadır.
- **İhale Bedeli** : 260.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 0
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 2017 /
- **Proje Detayı** : Ceylanpınar Belediyesi kendi öz kaynakları ile çalışma yapmaktadır. Gerçekleştirilecek



CEYLANPINAR BELEDİYESİ LED ARMATÜR İLE CADDE AYDINLATMA PROJESİ



- **İhale Tarihi** : Kurum Kendi Hizmet alma / Satın Alma Yöntemiyle Çalışmaktadır.
- **İhale Bedeli** : 2.000.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 0 (1011. Cadde – 1012. cadde)
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 2017
- **Proje Detayı** : Ceylanpınar Belediyesi Kendi Öz kaynakları ile çalışma yapmaktadır. Gerçekleştirilecek



CEYLANPINAR GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ



- **İhale Tarihi** : 08.03.2017
- **İhale Bedeli** : 3.000.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** : % 0
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** : % 0
- **Başlama / Bitiş Tarihi** : 01.06.2017 / 01.06.2018
- **Proje Detayı** : Gençlik Ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilerek Gerçekleştirilecek





EYYÜBİYE BELEDİYESİ

EYYÜBİYE BELEDİYESİNİN DEVAM EDEN 3 ADET YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

OSMANLI MAHALLESİ GENÇLİK KÜLLİYESİ YAPIM İŞİ.



- **İhale Tarihi** :24/03/2017
- **İhale Bedeli** :2.865.000
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:255.911.75
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :% 11
- **Başlama- Bitiş Tarihi** :28/04/2017---24/12/2017
- **Proje Detayı** :Zemin+2 Kat Parsel Alanı:9498 M2, İnşaat Alanı:2290 M2



HASTA YAKINLARI MİSAFİRHANESİ YAPIM İŞİ



- İhale Tarihi :29/03/2017
- İhale Bedeli :2.945.000
- Nakdi Gerçekleşme Oranı:%19
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :
- Başlama- Bitiş Tarihi :08/05/2017---24/12/2017
- Proje Detayı :Zemin+3 Kat, İnşaat Alanı:3360 m2



4 ADET MUHTARLIK EVİ YAPIM İŞİ.(YENİCE-SELÇUKLU-EYÜPKENT-DİREKLİ)



- **İhale Tarihi** :27/03/2017
- **İhale Bedeli** :170.000.00
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%50
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%80
- **Başlama- Bitiş Tarihi** :19/04/2017---17/08/2017
- **Proje Detayı** : inşaat kullanım alanı 55 m2 inşaat alanı





BOZOVA BELEDİYESİ

BOZOVA BELEDİYESİNE AİT; **2** ADET DEVAM EDEN VE **2** ADET PLANLANAN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA **4** ADET YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

BOZOVA FEVZİ ÇAKMAK TAZİYE EVİ PROJESİ



- İhale Tarihi :05.09.2017
- İhale Bedeli :
- Nakdi Gerçekleşme Oranı :
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :%0
- Başlama/Bitiş Tarihi :
- Proje Detayı :İhale Aşamasındadır



BOZOVA YEŐILOVA TAZIYE EVİ PROJESİ



- **İhale Tarihi** :05.09.2017
- **İhale Bedeli** :
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%0
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :
- **Proje Detayı** :İhale Aşamasındadır.



5 ADET AYDINLATMALI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI VE BASKETBOL-VOLEYBOL SAHASI YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :05.06.2017
- **İhale Bedeli** :997.256,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı** :
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%8
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :17.07.2017/17.12.2017
- **Proje Detayı** :Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Hibe Edilen 5 Adet Aydınlatmalı Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Ve Basketbol-voleybol Sahası Kırsal Mahallelerimizde Okul Bahçelerine Yapılmaktadır



HAMAM, KONUT, İŞYERİ, FİTNESS SALONU KOMPLEKS YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :12.07.2017
- **İhale Bedeli** :3.492.021,00 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı:**
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%30
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :09.08.2016





KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ

KARAKÖPRÜ BELEDİYESİNE AİT; **3** ADET DEVAM EDEN VE **1** ADET PLANLANAN OLMAK ÜZERE TOPLAMDA **4** ADET YATIRIM PROJESİ BULUNMAKTADIR.

KARAKÖPRÜ YAŞAM PARK PROJESİ



- **İhale Tarihi** :27.01.2016
- **İhale Bedeli** :13.670.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%85
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%85
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :15.03.2016-15.03.2018



KARAKÖPRÜ ESENTEPE 2 ADET OKUMA EVİ YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :28.02.2017
- **İhale Bedeli** :429.400 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%80
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%80
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :21.04.2017-15.08.2017



KARAKÖPRÜ MAŞUK MEYDAN VE OTOPARK YAPIM İŞİ



- **İhale Tarihi** :27.12.2016
- **İhale Bedeli** :1.074.000 TL
- **Nakdi Gerçekleşme Oranı**:%35
- **Fiziki Gerçekleşme Oranı** :%35
- **Başlama/Bitiş Tarihi** :13.02.2017-16.08.2017




KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ PARK YAPIM İŞİ



- İhale Tarihi :29.06.2017
- İhale Bedeli :780.000 TL
- Nakdi Gerçekleşme Oranı:
- Fiziki Gerçekleşme Oranı :
- Başlama/Bitiş Tarihi :
- Proje Detayı :İhale yapıldı, dosya ohal bürosunda.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

KARAKÖPRÜ 3372 PARSEL PARK PEYZAJ PROJESİ

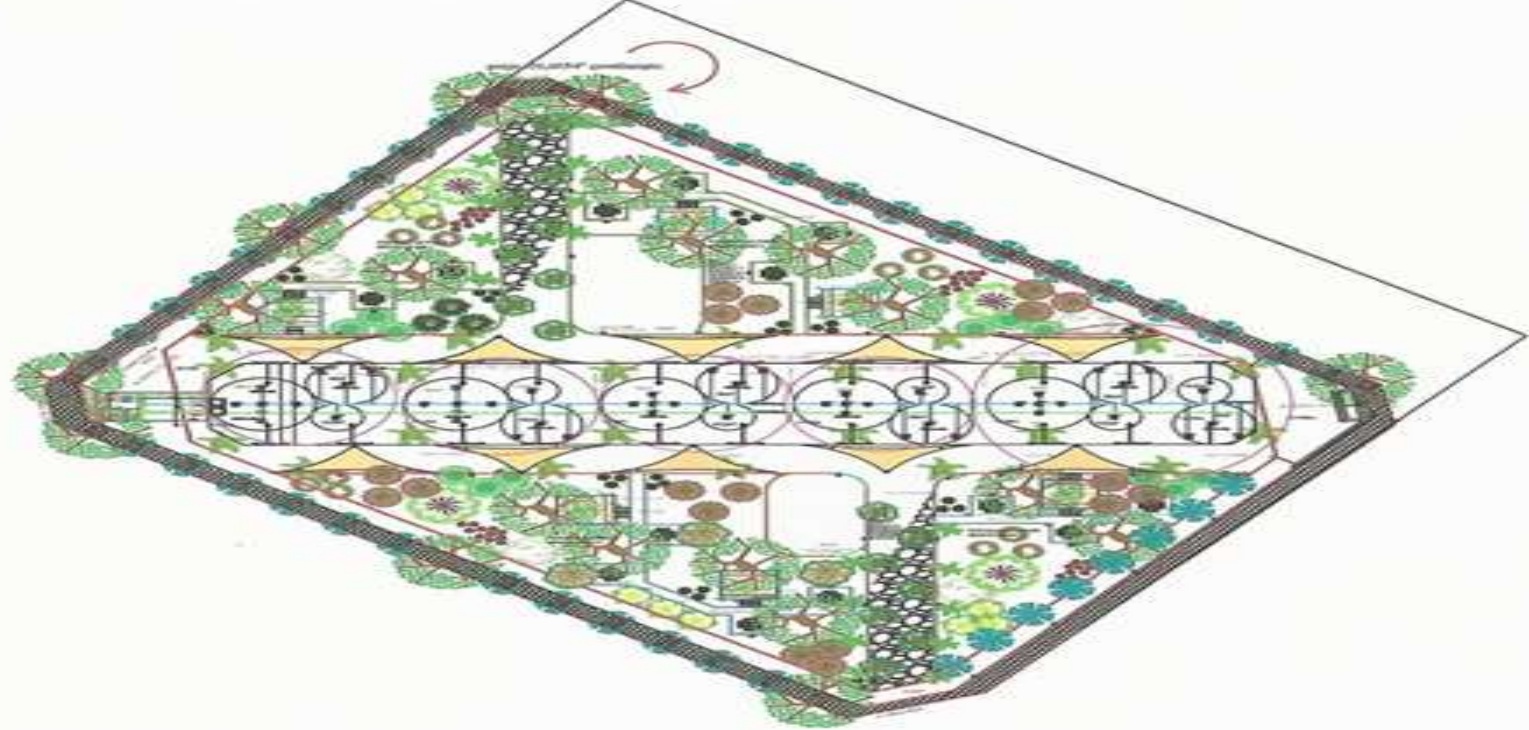

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
